




PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHIANG
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG**

Jln. Lintas Tebat Monok - Kelilik, KP. 39372, Kepahiang



LAPORAN RENCANA PEKERJAAN 02
BULAN PENGUJIAN

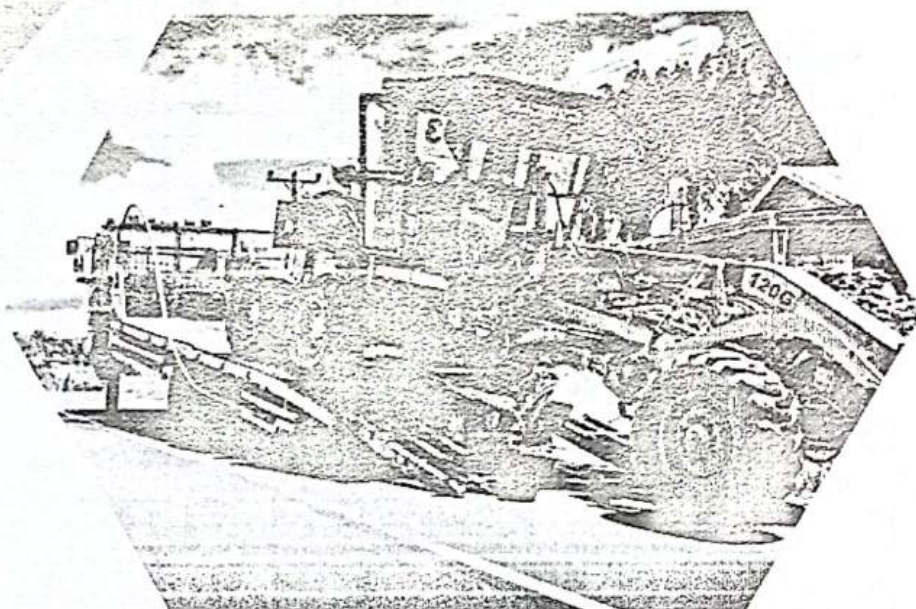

TAHUN ANGGARAN

2025



CV. PUTRA SAGO MANDIRI

Alamat Kantor : Jalan Aru Komplek Pemda No.238 RT.02 RW.05 Kel.
Lubuk Begalung Nan XX Kec. Lubuk Begalung Kota Padang

LAPORAN BULANAN

Pekerjaan : Peningkatan/Rekonstruksi Jalan Sosokan Taba - Cinto Mandi (Lanjutan DBH 2024)
 Prop / Kab / Kodya : Bengkulu / Kepahiang
 T. Anggaran : 2025
 Kontraktor : CV. PUTRA SAGO MANDIRI
 No Kontrak : 600.1.7/157/KNTRK/DPUPR/2025
 Tanggal Kontrak : 29 Agustus 2025

Bulan Ke : II (Dua)
 Periode : 27 September 2025 - 25 Oktober 2025

NO.	URAIAN PEKERJAAN	SAT	ADDENDUM		S/D BULAN LALU		BULAN INI		S/D BULAN INI	
			VOLUME	BOBOT %	VOLUME	BOBOT %	VOLUME	BOBOT %	VOLUME	BOBOT %
	DIVISI 1. UMUM									
1.2	Mobilisasi	LS	1,00	8,24	0,30	2,47	0,30	2,47	0,60	4,94
1.9	Keselamatan dan Kesehatan Kerja									
	Penyiapan dokumen penerapan SMK	Sel	1,00	0,13	0,30	0,04	0,30	0,04	0,00	0,08
	Alat Pelindung Diri									
SKh-1.1.22.(3b1)	Topi pelindung (Safety Helmet)	Buah	-	-						
SKh-1.1.22.(3b7)	Sarung tangan (Safety Gloves)	Pasang	-	-						
SKh-1.1.22.(3b8)	Sepatu keselamatan (Safety Shoes, rubber safety shoes)	Buah	-	-						
SKh-1.1.22.(3b11)	Rompi keselamatan (Safety Vest)	Buah	-	-						
	Asuransi dan Perlindungan terkait Keselamatan Konstruksi									
SKh-1.1.22.(4a)	Asuransi (Construction All Risk/CAR)	Ls	-	-						
	Personel Keselamatan Konstruksi									
SKh-1.1.22.(5c)	Petugas Keselamatan Konstruksi, Petugas K3	Orang	1,00	0,22	0,30	0,07	0,30	0,07	0,60	0,13
SKh-1.1.22.(5h)	Petugas pengatur lalu lintas	Orang	3,00	0,32	1,00	0,11	1,00	0,11	2,00	0,21
	Facilitas sarana, prasarana, dan alat kesehatan									
SKh-1.1.22.(6a)	Peralatan P3K	Sel	1,00	0,04	1,00	0,04	-	-	1,00	0,04
	Rambu dan Perlengkapan lalu lintas yang diperlukan atau manajemen lalu lintas									
SKh-1.1.22.(7a)	Rambu petunjuk	Buah	2,00	0,02	0,50	0,01	1,00	0,01	1,50	0,02
SKh-1.1.22.(7c)	Rambu peringatan	Buah	2,00	0,02	0,50	0,01	1,00	0,01	1,50	0,02
SKh-1.1.22.(7e)	Rambu informasi	Buah	2,00	0,02	0,50	0,01	1,00	0,01	1,50	0,02
SKh-1.1.22.(7h)	Kerucut lalu lintas (traffic cone)	Buah	2,00	0,02	0,50	0,01	1,00	0,01	1,50	0,02
	Kegiatan dan peralatan terkait Pengendalian Risiko Keselamatan Konstruksi									
SKh-1.1.22.(9a1)	Alat Pemadam Api Ringan (APAR)	Buah	1,00	0,04	0,30	0,01	0,70	0,03	1,00	0,04
SKh-1.1.22.(9a4)	Bendera K3	Buah	1,00	0,01	0,30	0,00	0,70	0,00	1,00	0,01
1.21	Manajemen Mutu	Ls	1,00	0,67	0,30	0,20	0,50	0,33	0,80	0,53
	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK									
3.2.(1a)	Timbunan Pilihan dan Sumber Galian	M3	230,30	14,35	230,30	14,35	-	-	230,30	14,35
3.3.(1)	Penyiapan Badan Jalan	M2	1.450,40	1,14	1.450,40	1,14	-	-	1.450,40	1,14
	DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON SEMEN									
5.1.(1)	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	M3	200,91	18,64	-	-	200,91	18,64	200,91	18,64
	DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL									
6.1(1)	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi	Liter	1.339,40	2,51	-	-	1.339,40	2,51	1.339,40	2,51
6.1 (2a)	Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi	Liter	194,25	0,35	-	-	194,25	0,35	194,25	0,35
6.3 (5a)	Latan Lapis Aus (AC-WC)	Ton	114,72	19,57	-	-	114,72	19,57	114,72	19,57
6.3(6a)	Laston Lapis Antara (AC-BC)	Ton	172,85	28,65	-	-	172,85	28,65	172,85	28,65
6.3.(8)	Bahan Anti Pengelupasan	Kg	48,32	0,34	-	-	48,32	0,34	48,32	0,34
	DIVISI 7 STRUKTUR									
7.1.(8)	Beton fc' 15 Mpa	M3	17,58	2,94	-	-	3,00	0,50	3,00	0,50
	DIVISI 9. PEKERJAAN HARIAN DAN PEKERJAAN LAIN-LAIN									
9.2.(1)	Marka Jalan Termoplastik	M2	88,80	1,75	-	-	-	-	-	-
	Jumlah			100,00		18,45		73,65		92,11

Disetujui Oleh,
 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
 DINAS PUPR KAB. KEPAHIANG

Diperiksa Oleh
 Konsultan Pengawas
 PT. PANDU SATYA PERKASA

Dibuat Oleh
 Kontraktor Pelaksana
 CV.PUTRA SAGO MANDIRI

Ir. HARDIONO, S.T., M.T
 NIP. 197609022010011009

ARIS SAPUTRA, S.T
 Supervision Engineer

ROSYID ABDULLOH AL AZIZ, ST
 Manajer Proyek

LAPORAN MINGGUAN

Pekerjaan : Peningkatan/Rekonstruksi Jalan Sosokan Tabu - Cinto Mandi (Lanjutan DBH 2024)
 Prop / Kab / Kodya : Bengkulu / Kepahiang
 T. Anggaran : 2025
 Kontraktor : CV. PUTRA SAGO MANDIRI
 No. Kontrak : 600.1.7/157/KNTRK/DPUPR/2025
 Tanggal Kontrak : 29 Agustus 2025

No. Addendum 01 : 600.1.7/157/KNTRK/DPUPR/2025
 Tanggal Addendum 01 : 22 September 2025
 Minggu Ke : VI (Enam)
 Periode : 28 September 2025 - 04 Oktober 2025

NO.	URAIAN PEKERJAAN	SAT	ADDENDUM		S/D MINGGU LALU		MINGGU INI		S/D MINGGU INI	
			VOLUME	BOBOT %	VOLUME	BOBOT %	VOLUME	BOBOT %	VOLUME	BOBOT %
	DIVISI 1. UMUM									
1.2	Mobilisasi	LS	1,00	8,24	0,30	2,47	-	-	0,30	2,47
1.9	Keselamatan dan Kesehatan Kerja									
	Penyiapan dokumen penerapan SMK	Set	1,00	0,13	0,30	0,04	-	-	0,30	0,04
	Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri									
SKh-1.1.22.(3b1)	Topi pelindung (Safety Helmet)	Buah	-	-	-	-	-	-	-	-
SKh-1.1.22.(3b7)	Sarung tangan (Safety Gloves)	Pasang	-	-	-	-	-	-	-	-
SKh-1.1.22.(3b8)	Sepatu keselamatan (Safety Shoes, rubber safety shoes)	Buah	-	-	-	-	-	-	-	-
SKh-1.1.22.(3b11)	Rompi keselamatan (Safety Vest)	Buah	-	-	-	-	-	-	-	-
	Asuransi dan Perizinan terkait Keselamatan Konstruksi									
SKh-1.1.22.(4a)	Asuransi (Construction All Risk/CAR)	Ls	-	-	-	-	-	-	-	-
	Personel Keselamatan Konstruksi									
SKh-1.1.22.(6c)	Petugas Keselamatan Konstruksi, Petugas K3	Orang	1,00	0,22	0,30	0,07	-	-	0,30	0,07
SKh-1.1.22.(6h)	Petugas pengatur lalu lintas	Orang	3,00	0,32	1,00	0,11	-	-	1,00	0,11
	Facilitas sarana, prasarana, dan alat kesehatan									
SKh-1.1.22.(6a)	Peralatan P3K	Set	1,00	0,04	1,00	0,04	-	-	1,00	0,04
	Rambu dan Perlengkapan lalu lintas yang diperlukan atau manajemen lalu lintas									
SKh-1.1.22.(7a)	Rambu petunjuk	Buah	2,00	0,02	0,50	0,01	-	-	0,50	0,01
SKh-1.1.22.(7c)	Rambu peringatan	Buah	2,00	0,02	0,50	0,01	-	-	0,50	0,01
SKh-1.1.22.(7e)	Rambu informasi	Buah	2,00	0,02	0,50	0,01	-	-	0,50	0,01
SKh-1.1.22.(7h)	Kerucut lalu lintas (traffic cone)	Buah	2,00	0,02	0,50	0,01	-	-	0,50	0,01
	Kegiatan dan peralatan terkait Pengendalian Risiko Keselamatan Konstruksi									
SKh-1.1.22.(9a1)	Alat Pemadam Api Ringan (APAR)	Buah	1,00	0,04	0,30	0,01	-	-	0,30	0,01
SKh-1.1.22.(9a4)	Bendera K3	Buah	1,00	0,01	0,30	0,00	-	-	0,30	0,00
1.21	Manajemen Mutu	Ls	1,00	0,67	0,30	0,20	-	-	0,30	0,20
	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK									
3.2.(1a)	Timbunan Pilihan dan Sumber Galian	M3	230,30	14,35	230,30	14,35	-	-	230,30	14,35
3.3.(1)	Penyiapan Badan Jalan	M2	1.450,40	1,14	1.450,40	1,14	-	-	1.450,40	1,14
	DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON SEMEN									
5.1.(1)	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	M3	200,91	18,64	-	-	200,91	18,64	200,91	18,64
	DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL									
6.1.(1)	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi	Liter	1.339,40	2,51	-	-	-	-	-	-
6.1.(2a)	Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi	Liter	194,25	0,35	-	-	-	-	-	-
6.3.(5a)	Latan Lapis Aus (AC-WC)	Ton	114,72	19,57	-	-	-	-	-	-
6.3.(6a)	Laston Lapis Antara (AC-5C)	Ton	172,85	28,65	-	-	-	-	-	-
6.3.(8)	Behan Anti Pengelupasan	Kg	48,32	0,34	-	-	-	-	-	-
	DIVISI 7. STRUKTUR									
7.1.(8)	Beton fc' 15 Mpa	M3	17,58	2,84	-	-	-	-	-	-
	DIVISI 9. PEKERJAAN HARIAN DAN PEKERJAAN LAIN-LAIN									
9.2.(1)	Marka Jalan Termoplastik	M2	88,80	1,75	-	-	-	-	-	-
	Jumlah			100,00		18,45		18,64		37,09
	RENCANA PROGRESS S/D MINGGU INI									3,49
	REALISASI PROGRESS S/D MINGGU INI									37,09
	DEVIASI									33,60

Disetujui Oleh:
 PENGAWAS LAPANGAN
 DPUPR KABUPATEN KEPAHIANG

Diperiksa Oleh:
 KONSULTAN PENGAWAS
 PT. PANDU SATYA PERKASA

Dibuat Oleh:
 KONTRAKTOR PELAKSANA
 CV. PUTRA SAGO MANDIRI

ABDUL HARI, ST
 Nip. 19810311 200604 1 007

DZHUHAD AGAM R, ST
 Inspector

RAZI HARDIANTO, ST
 Pelaksana



PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHANG
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG

Jln. Lintas Tebat Monok - Kelilik, KP. 39372, Kepohlang

**LAPORAN HARIAN**

Nama Pict	Peningkatan/Rekonstruksi Jalan SOSOKAN TABA - CINTO MANDI (LANJUTAN DBH 2024)
Lokasi Pekerjaan	Kecamatan Kephaling
T. Anggapan	2025
Kontraktor	CV. PUTRA SAGO MANDIRI
Konsultan	CV. NUGRAHA CONSULTANT

HALAMAN : 7
Tanggal : 26/10/2025
Hari : Sabtu

A. PEKERJAAN

No Item	Jenis Pekerjaan (Satuan)	Volume	Satuan
	DIVISI 1. UMUM		
1.2	Mobilisasi		LS
1.6	Keselamatan dan Kesehatan Kerja		
	Penyusunan dokumen perencanaan SMKK		
	Personel Keselamatan Konstruksi		Set
SKh-1.1.22	Petugas Keselamatan Konstruksi, Petugas K3		Orang
SKh-1.1.22	Petugas pengatur lalu lintas		Orang
	Facilities sarana, prasarana, dan alat kesehatan		
SKh-1.1.22	Penalaran PJK		Set
	Rambu dan Penempatan lalu lintas yang diperlukan atau manajemen lalu lintas		
SKh-1.1.22	Rambu petunjuk		Buah
SKh-1.1.22	Rambu peringatan		Buah
SKh-1.1.22	Rambu Informasi		Buah
SKh-1.1.22	Kerucut lalu lintas (traffic cone)		Buah
	Kegiatan dan peralatan terkait Pengendalian Risiko Keselamatan Konstruksi		
SKh-1.1.22	Alat Pemadam Api Ringan (APAR)		Buah
SKh-1.1.22	Bendera K3		Buah
1.21	Manajemen Mutu		LS
	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK		
3.2 (1a)	Timbunan Pilihan dari Sumber Galan		M3
3.3 (1)	Penyulpan Badan Jalan		M2
	DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON SEMEN		
5.1 (1)	Lapis Pondasi Agregat Kelas A		M3
	DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL		
6.1 (1)	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi		Liter
6.1 (2a)	Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi		Liter
6.3 (5a)	Latan Lapis Atas (AC-WC)		Ton
6.3 (6a)	Latan Lapis Antara (AC-BC)		Ton
6.3 (8)	Bahan Anti Pengelupasan		Kg
	DIVISI 7. STRUKTUR		
7.1 (8)	Beton f'c 15 Mpa	3.00	M3
	DIVISI 9. PEKERJAAN HARIAN DAN PEKERJAAN LAIN-LAIN		
9.2 (1)	Marka Jalan Termoplastik		M2

B. TIBA/MUTASI : PERALATAN & BAHAN KONSTRUKSI POKOK

[illegible]

C. PEMAKAIAN PERALATAN

[illegible]

D. PERSONIL PROYEK : TIM SUPERVISI / KONTRAKTOR

Nama		
Petugas / Jabatan	Jumlah	Lokasi
A. PROYEK		
1 Pengawas Lapangan	1 org	kepahlang
B. TIM SUPERVISI		
1 Supervision Engineer	1 org	kepahlang
2 Inspector	1 org	kepahlang
C. KONTRAKTOR		
1 Site Manager		kepahlang
2 Pelaksana	1 org	kepahlang
3 Manajemen Konstruksi		kepahlang
4 Manajemen Kendali Mutu	1 org	kepahlang
5 K3 Konstruksi	1 org	kepahlang
6 Administrasi Teknik	1 org	kepahlang
7 Logistik	1 org	kepahlang
8 Mandor	1 org	kepahlang
9 Tukang		kepahlang
10 Pekerja	2 org	kepahlang

E. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT KEGIATAN

[illegible]

F. USUL / PENGAJUAN / KESEPAKATAN / PELAPORAN

URAIAN	NAMA JELAS	TANDA TANGAN
Kontraktor	CV PUTRA SAGO MANDIRI	RAZI HARDIANTO. ST
Konsultan	PT PANDU SATYA PERKASA	DZULHAD AGAM R. ST




PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHANG
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG**

Jln. Lintas Tebat Monok - Kelilik. KP. 39372. Kepahiang



**LAPORAN KEMAJUAN PEKERJAAN
BULANAN, MINGGUAN DAN HARIAN**

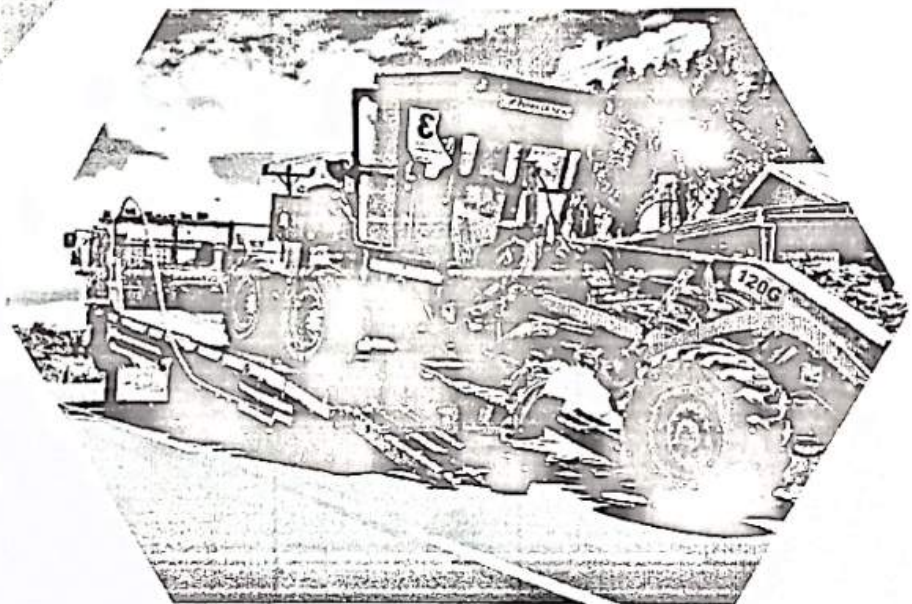

TAHUN ANGGARAN

2025



CV. PUTRA SAGO MANDIRI

Alamat Kantor : Jalan Aru Komplek Pemda No.238 RT.02 RW.05 Kel.
Lubuk Begalung Nan XX Kec. Lubuk Begalung Kota Padang

LAPORAN BULANAN

Pekerjaan : Peningkatan/Rekonstruksi Jalan Sosokan Tabu - Cinto Mandi (Lanjutan DBH 2024)
 Prop / Kab / Kota : Bengkulu / Kepahiang
 T. Anggaran : 2025
 Kontraktor : CV. PUTRA SAGO MANDIRI
 No Kontrak : 600.1.7/157/KNTRK/DPUPR/2025
 Tanggal Kontrak : 29 Agustus 2025

Bulan Ke : I (Satu)
 Periode : 29 Agustus 2025 - 27 September 2025

NO.	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KONTRAK		S/D BULAN LALU		BULAN INI		S/D BULAN INI	
			VOLUME	BOBOT %	VOLUME	BOBOT %	VOLUME	BOBOT %	VOLUME	BOBOT %
	DIVISI 1. UMUM									
1.2	Mobilisasi	LS	1,00	8,24			0,30	2,47	0,30	2,47
1.9	Keselamatan dan Kesehatan Kerja									
	Penyiapan dokumen penerapan SMK	Set	1,00	0,13			0,30	0,04	0,30	0,04
	Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri									
SKh-1.1.22.(3b1)	Topi pelindung (Safety Helmet)	Buah	-	-						
SKh-1.1.22.(3b7)	Sarung tangan (Safety Gloves)	Pasang	-	-						
SKh-1.1.22.(3b8)	Sepatu keselamatan (Safety Shoes, rubber safety shoes)	Buah	-	-						
SKh-1.1.22.(3b11)	Rompi keselamatan (Safety Vest)	Buah	-	-						
	Asuransi dan Perizinan terkait Keselamatan Konstruksi									
SKh-1.1.22.(4a)	Asuransi (Construction All Risk/CAR)	Ls	-	-						
	Personel Keselamatan Konstruksi									
SKh-1.1.22.(5c)	Petugas Keselamatan Konstruksi, Petugas K3	Orang	1,00	0,22			0,30	0,07	0,30	0,07
SKh-1.1.22.(5h)	Petugas pengatur lalu lintas	Orang	3,00	0,32			1,00	0,11	1,00	0,11
	Facilitas sarana, prasarana, dan alat kesehatan									
SKh-1.1.22.(6a)	Peralatan P3K	Set	1,00	0,04			1,00	0,04	1,00	0,04
	Rambu dan Perlengkapan lalu lintas yang diperlukan atau manajemen lalu lintas									
SKh-1.1.22.(7a)	Rambu petunjuk	Buah	2,00	0,02			0,50	0,01	0,50	0,01
SKh-1.1.22.(7c)	Rambu peringatan	Buah	2,00	0,02			0,50	0,01	0,50	0,01
SKh-1.1.22.(7e)	Rambu informasi	Buah	2,00	0,02			0,50	0,01	0,50	0,01
SKh-1.1.22.(7h)	Kerucut lalu lintas (traffic cone)	Buah	2,00	0,02			0,50	0,01	0,50	0,01
	Kegiatan dan peralatan terkait Pengendalian Risiko Keselamatan Konstruksi									
SKh-1.1.22.(9a1)	Alat Pemadam Api Ringan (APAR)	Buah	1,00	0,04			0,30	0,01	0,30	0,01
SKh-1.1.22.(9a4)	Bendera K3	Buah	1,00	0,01			0,30	0,00	0,30	0,00
1.21	Manajemen Mutu	Ls	1,00	0,67			0,30	0,20	0,30	0,20
	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK									
3.2.(1a)	Timbunan Filhan dan Sumber Galian	M3	284,38	17,72			230,30	14,35	230,30	14,35
3.3.(1)	Penyiapan Badan Jalan	M2	1.137,50	0,89			1.450,40	1,14	1.450,40	1,14
	DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON SEMEN									
5.1.(1)	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	M3	170,83	15,83			-	-	-	-
	DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL									
6.1.(1)	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi	Liter	1.137,50	2,13			-	-	-	-
6.1.(2a)	Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi	Liter	284,38	0,51			-	-	-	-
6.3.(5a)	Laton Lapis Aus (AC-WC)	Ton	101,47	17,31			-	-	-	-
6.3.(6a)	Leston Lapis Antara (AC-BC)	Ton	156,98	28,02			-	-	-	-
6.3.(8)	Bahan Anti Pengelupasan	Kg	17,58	0,13			-	-	-	-
	DIVISI 7. STRUKTUR									
7.1.(8)	Beton f'c 15 Mpa	M3	48,75	8,17			-	-	-	-
	DIVISI 9. PEKERJAAN HARIAN DAN PEKERJAAN LAIN-LAIN									
9.2.(1)	Marka Jalan Termoplastik	M2	78,00	1,54			-	-	-	-
	Jumlah			100,00		-		18,45		18,45

Disetujui Oleh,
 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
 DINAS PUPR KAB. KEPAHIANG

Ir. HARDIONO, S.T., M.T.
 NIP. 197609022010011009

Diperiksa Oleh
 Konsultan Pengawas
 PT. PANDU SATYA PERKASA

ARIS SAPUTRA, S.T.
 Supervision Engineer

Dibuat Oleh
 Kontraktor Pelaksana
 CV.PUTRA SAGO MANDIRI

ROSYID ABDULLOH AL AZIZ, ST
 Manajer Proyek

LAPORAN MINGGUAN

Pekerjaan : Peningkatan/Rekonstruksi Jalan Sosokan Taba - Cinto Mandi (Lanjutan DBH 2024)
 Prop / Kab / Kodya : Bengkulu / Kepahiang
 T. Anggaran : 2025
 Kontraktor : CV. PUTRA SAGO MANDIRI
 No.Kontrak : 600.1.7/157/KNTRK/DPUPR/2025
 Tanggal Kontrak : 29 Agustus 2025

Minggu Ke : 1 (Satu)
 Periode : 29 Agustus 2025 - 30 Agustus 2025

NO.	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KONTRAK		S/D MINGGU LALU		MINGGU INI		S/D MINGGU INI	
			VOLUME	BOBOT %	VOLUME	BOBOT %	VOLUME	BOBOT %	VOLUME	BOBOT %
	DIVISI 1. UMUM									
1.2	Mobilisasi	LS	1,00	8,24						
1.9	Keselamatan dan Kesehatan Kerja									
	Penyiapan dokumen penerapan SMK	Set	1,00	0,13						
	Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri									
SKh-1.1.22.(3b1)	Topi pelindung (Safety Helmet)	Buah	-	-						
SKh-1.1.22.(3b7)	Sarung tangan (Safety Gloves)	Pasang	-	-						
SKh-1.1.22.(3b8)	Sepatu keselamatan (Safety Shoes, rubber safety shoes)	Buah	-	-						
SKh-1.1.22.(3b11)	Rompi keselamatan (Safety Vest)	Buah	-	-						
	Asuransi dan Perizinan terkait Keselamatan Konstruksi									
SKh-1.1.22.(4a)	Asuransi (Construction All Risk/CAR)	Ls	-	-						
	Personel Keselamatan Konstruksi									
SKh-1.1.22.(5c)	Petugas Keselamatan Konstruksi, Petugas K3	Orang	1,00	0,22						
SKh-1.1.22.(5h)	Petugas pengatur lalu lintas	Orang	3,00	0,32						
	Facilitas sarana, prasarana, dan alat kesehatan									
SKh-1.1.22.(6a)	Peralatan P3K	Set	1,00	0,04						
	Rambu dan Perlengkapan lalu lintas yang diperlukan atau manajemen lalu lintas									
SKh-1.1.22.(7a)	Rambu petunjuk	Buah	2,00	0,02						
SKh-1.1.22.(7c)	Rambu peringatan	Buah	2,00	0,02						
SKh-1.1.22.(7e)	Rambu informasi	Buah	2,00	0,02						
SKh-1.1.22.(7h)	Kerucut lalu lintas (traffic cone)	Buah	2,00	0,02						
	Kegiatan dan peralatan terkait Pengendalian Risiko Keselamatan Konstruksi									
SKh-1.1.22.(9a1)	Alat Pemadam Api Ringan (APAR)	Buah	1,00	0,04						
SKh-1.1.22.(9a4)	Bendera K3	Buah	1,00	0,01						
1.21	Manajemen Mutu	Ls	1,00	0,67						
	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK									
3.2.(1a)	Timbunan Pilihan dan Sumber Galian	M3	284,38	17,72						
3.3.(1)	Penyiapan Badan Jalan	M2	1.137,50	0,89						
	DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON SEMEN									
5.1.(1)	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	M3	170,63	15,83						
	DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL									
6.1.(1)	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi	Liter	1.137,50	2,13						
6.1.(2a)	Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi	Liter	284,38	0,51						
6.3.(5a)	Lafon Lapis Aus (AC-WC)	Ton	101,47	17,31						
6.3.(6a)	Lafon Lapis Antara (AC-BC)	Ton	156,98	26,02						
6.3.(8)	Bahan Anti Pengelupasan	Kg	17,58	0,13						
	DIVISI 7. STRUKTUR									
7.1.(8)	Beton fc' 15 Mpa	M3	48,75	8,17						
	DIVISI 9. PEKERJAAN HARIAN DAN PEKERJAAN LAIN-LAIN									
9.2.(1)	Marka Jalan Termoplastik	M2	78,00	1,54						
	Jumlah		100,00							
	RENCANA PROGRESS S/D MINGGU INI									
	REALISASI PROGRESS S/D MINGGU INI									
	DEVIASI									

Disetujui Oleh :
 PENGAWAS LAPANGAN
 DPUPR KABUPATEN KEPAHANG

Diperiksa Oleh :
 KONSULTAN PENGAWAS
 PT. PANDU SATYA PERKASA

Dibuat Oleh :
 KONTRAKTOR PELAKSANA
 CV. PUTRA SAGO MANDIRI

ABDUL KARIS, ST
 Nip. 19810311200604 1 007

DZHUHAD AGAM R, ST
 Inspector

RAZI HARDIANTO, ST
 Pelaksana




PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHANG
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG**

Jln. Lintas Tebat Monok - Kelilik. KP. 39372. Kepahiang



**LAPORAN KEMAJUAN PEKERJAAN 03
BULAN, MINGGU & HARIAN**

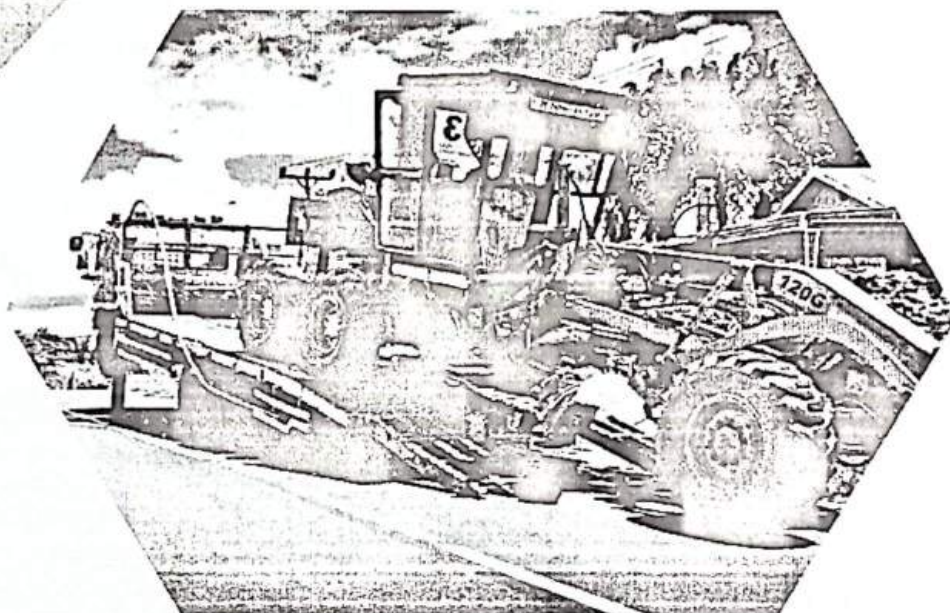

TAHUN ANGGARAN

2025



CV. PUTRA SAGO MANDIRI

Alamat Kantor : Jalan Aru Komplek Pemda No.238 RT.02 RW.05 Kel.
Lubuk Begalung Nan XX Kec. Lubuk Begalung Kota Padang

LAPORAN BULANAN

Pekerjaan : Peningkatan/Rekonstruksi Jalan Sosokan Taba - Cinto Mandi (Lanjutan DBH 2024)
 Prop / Kab / Kodya : Bengkulu / Kepahiang
 T. Anggaran : 2025
 Kontraktor : CV. PUTRA SAGO MANDIRI
 No Kontrak : 600 1.7/157/KNTRK/DPUPR/2025
 Tanggal Kontrak : 29 Agustus 2025


Bulan Ke : III (Tiga)
 Periode : 26 Oktober 2025 - 26 November 2025

NO.	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KONTRAK		S/D BULAN LALU		BULAN INI		S/D BULAN INI	
			VOLUME	BOBOT %	VOLUME	BOBOT %	VOLUME	BOBOT %	VOLUME	BOBOT %
	DIVISI 1. UMUM									
1.2	Mobilisasi	LS	1,00	8,24	0,60	4,94	0,40	3,30	1,00	8,24
1.9	Keselamatan dan Kesehatan Kerja									
	Penyiapan dokumen penerapan SMK	Set	1,00	0,13	0,60	0,08	0,40	0,05	1,00	0,13
	Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri									
SKh-1.1.22.(3b1)	Topi pelindung (Safety Helmet)	Buah	-	-						
SKh-1.1.22.(3b7)	Sarung tangan (Safety Gloves)	Pasang	-	-						
SKh-1.1.22.(3b8)	Sepatu keselamatan (Safety Shoes, rubber safety shoe)	Buah	-	-						
SKh-1.1.22.(3b11)	Rompi keselamatan (Safety Vest)	Buah	-	-						
	Asuransi dan Perizinan terkait Keselamatan Konstruksi									
SKh-1.1.22.(4a)	Asuransi (Construction All Risk/CAR)	Ls	-	-						
	Personel Keselamatan Konstruksi									
SKh-1.1.22.(5c)	Petugas Keselamatan Konstruksi, Petugas K3	Orang	1,00	0,22	0,60	0,13	0,40	0,09	1,00	0,22
SKh-1.1.22.(5h)	Petugas pengatur lalu lintas	Orang	3,00	0,32	2,00	0,21	1,00	0,11	3,00	0,32
	Facilitas sarana, prasarana, dan alat kesehatan									
SKh-1.1.22.(6a)	Peralatan P3K	Set	1,00	0,04	1,00	0,04	-	-	1,00	0,04
	Rambu dan Pertengkapan lalu lintas yang diperlukan atau manajemen lalu lintas									
SKh-1.1.22.(7a)	Rambu petunjuk	Buah	2,00	0,02	1,50	0,02	0,50	0,01	2,00	0,02
SKh-1.1.22.(7c)	Rambu peringatan	Buah	2,00	0,02	1,50	0,02	0,50	0,01	2,00	0,02
SKh-1.1.22.(7e)	Rambu informasi	Buah	2,00	0,02	1,50	0,02	0,50	0,01	2,00	0,02
SKh-1.1.22.(7h)	Kerucut lalu lintas (traffic cone)	Buah	2,00	0,02	1,50	0,02	0,50	0,01	2,00	0,02
	Kegiatan dan peralatan terkait Pengendalian Risiko Keselamatan Konstruksi									
SKh-1.1.22.(9a1)	Alat Pemadam Api Ringan (APAR)	Buah	1,00	0,04	1,00	0,04	-	-	1,00	0,04
SKh-1.1.22.(9a4)	Bendera K3	Buah	1,00	0,01	1,00	0,01	-	-	1,00	0,01
1.21	Manajemen Mutu	Ls	1,00	0,67	0,80	0,53	0,20	0,13	1,00	0,67
	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK									
3.2.(1a)	Timbunan Pilihan dan Sumber Galian	M3	230,30	14,35	230,30	14,35	-	-	230,30	14,35
3.3.(1)	Penyiapan Badan Jalan	M2	1.450,40	1,14	1.450,40	1,14	-	-	1.450,40	1,14
	DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON SEMEN									
5.1.(1)	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	M3	200,91	18,64	200,91	18,64	-	-	200,91	18,64
	DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL									
6.1(1)	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi	Liter	1.339,40	2,51	1.339,40	2,51	-	-	1.339,40	2,51
6.1 (2a)	Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi	Liter	194,25	0,35	194,25	0,35	-	-	194,25	0,35
6.3 (5a)	Laiton Lapis Aus (AC-WC)	Ton	114,72	19,57	114,72	19,57	-	-	114,72	19,57
6.3(6a)	Laslon Lapis Antara (AC-BC)	Ton	172,85	28,65	172,85	28,65	-	-	172,85	28,65
6.3.(8)	Bahan Anti Pengelupasan	Kg	48,32	0,34	48,32	0,34	-	-	48,32	0,34
	DIVISI 7. STRUKTUR									
7.1.(1)	Beton 10 MPa	m3	17,60	2,01	9,90	0,90	11,90	2,11	17,60	2,01
	DIVISI 9. PEKERJAAN HARIAN DAN PEKERJAAN LAIN-LAIN									
9.2.(1)	Marka Jalan Termoplastik	M2	88,80	1,75	-	-	88,80	1,75	88,80	1,75
	Jumlah			100,00		92,11		7,89		100,00

Disetujui Oleh,
 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
DINAS PUPR KAB. KEPAHIANG

Diperiksa Oleh
 Konsultan Pengawas
PT. PANDU SATYA PERKASA

Dibuat Oleh
 Kontraktor Pelaksana
CV.PUTRA SAGO MANDIRI


Ir. HARDIONO, S.T., M.T
 NIP. 197609022010011009


ARIS SAPUTRA, S.T
 Supervision Engineer


ROSYID ABDULLOH AL AZZ, ST
 Manajer Proyek



PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHANG
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG

Jln. Lintas Tebat Monok - Kelilik, KP. 39372, Kepohiang

**LAPORAN HARIAN**

Nama Paket : Peninjauan Kembali dan Pengawasan Pelaksanaan Pekerjaan (LANJUTAN DBH 2024)
 Lokasi Pekerjaan : Kecamatan Kepahiang
 T. Anggaran : 2025
 Kontraktor : CV. PUTRA SAGO MANDIRI
 Aspek : CV. NUGRAHA CONSULTANT

HALAMAN : 4
Tanggal : 26/11/2025
Hari : Rabu

A. PEKERJAAN

No Item Pekerjaan	Jenis Pekerjaan (Satuan)	Volume	Satuan
	DIVISI 1. UMUM		
12	Mobilisasi		LS
19	Keselamatan dan Kesehatan Kerja		
	Penyusunan dokumen penerapan SMK3		Set
	Personel Keselamatan Konstruksi		
SN-11.22	Pelugas Keselamatan Konstruksi: Pelugas K3		Orang
SN-11.22	Pelugas pengatur lalu lintas		Orang
	Facilitas sarana, pressarana, dan alat kesehatan		
SN-11.22	Peralatan P3K		Set
	Rambu dan Perlengkapan lalu lintas yang diperlukan atau manajemen lalu lintas		
SN-11.22	Rambu petunjuk		Buah
SN-11.22	Rambu peringatan		Buah
SN-11.22	Rambu informasi		Buah
SN-11.22	Kerucut lalu lintas (traffic cone)		Buah
	Kegiatan dan peralatan terkait Pengendalian Risiko Keselamatan Konstruksi		
SN-11.22	Alat Pemadam Api Rangan (APAR)		Buah
SN-11.22	Bendera K3		Buah
121	Manajemen Mutu		LS
	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK		
32 (1a)	Timbunan Pilihan dan Sumber Galian		M3
33 (1)	Penyusunan Badan Jalan		M2
	DIVISI 3. PERKERASAN BEP BUTIR DAN PERKERASAN BETON SEMEN		
51 (1)	Lapis Pondasi Agregat Kelas A		M3
	DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL		
61 (1)	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi		Liter
61 (2a)	Lapis Perkeras - Aspal Cair/Emulsi		Liter
63 (5a)	Laiton Lapis Atas (AC-11C)		Ton
63 (5a)	Laiton Lapis Antara (AC-BC)		Ton
63 (5)	Bahan Anti Pelapukan		Kg
	DIVISI 7. STRUKTUR		
71 (8)	Beton fc' 15 Mpa		M3
	DIVISI 9. PEKERJAAN HARIAN DAN PEKERJAAN LAIN-LAIN		
92 (1)	Marka Jalan Termoplastik		M2

B. TIBAJMUTASI : PERALATAN & BAHAN KONSTRUKSI POKOK

[illegible]

C. PENAKAIAN PERALATAN

[illegible]

3 PERSONIL PROYEK : TIM SUPERVISI / KONTRAKTOR

PERSONIL PROYEK : TIM SUPERVISI / KONTRAKTOR		
Nama Petugas / Jabatan	Jumlah	Lokasi
A. PROYEK		
1. Pengawas Lapangan	1 org	kepahiang
B. TIM SUPERVISI		
1. Supervision Engineer	1 org	kepahiang
2. Inspector	1 org	kepahiang
C. KONTRAKTOR		
1. Site Manager	1 org	kepahiang
2. Pelaksana	1 org	kepahiang
3. Manajemen Konstruksi	1 org	kepahiang
4. Manajemen Kendali Mutu	1 org	kepahiang
5. K3 Konstruksi	1 org	kepahiang
6. Administrasi Teknik	1 org	kepahiang
7. Logistik	1 org	kepahiang
8. Mandor	1 org	kepahiang
9. Tukang	1 org	kepahiang
10. Perekam	2 org	kepahiang

E. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT KEGIATAN

[illegible]

REVISI / PENGALIHAN / KESEPAKATAN / PELAPORAN

KESIMPULAN / PENGARUAN / KESEPAKATAN / PELAPORAN		NAMA JELAS	TANDA TANGAN
Komentar:	URAIAN	RAZI HARDIANTO. ST	
Konsultan:	CV. PUTRA SAGO MANDIRI	DZULHAD AGAM R. ST	
	PT. PANDU SATYA PERKASA		




PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHANG
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG**

Jln. Lintas Tebat Monok - Kelilik. KP. 39372. Kepahiang



**JOB MIX FORMULA
LAPIS PONDASI AGREGAT KELAS A**

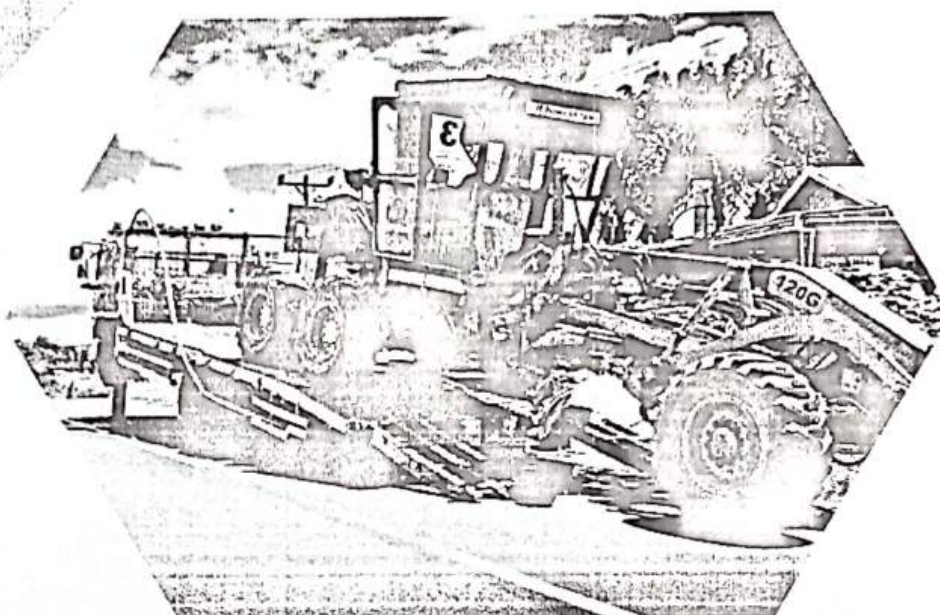

TAHUN ANGGARAN

2025



CV. PUTRA SAGO MANDIRI

Alamat Kantor : Jalan Aru Komplek Pemda No.238 RT.02 RW.05 Kel.
Lubuk Begalung Nan XX Kec. Lubuk Begalung Kota Padang

PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHIANG
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG



LEMBAR PENGESAHAN
JOB MIX FORMULA
AGGREGAT KELAS A

PENINGKATAN / REKONSTRUKSI JALAN SOSOKAN TABA - CINTO MANDI (LANJUTAN DBH 2024)

Kontraktor Pelaksana
CV. PUTRA SAGO MANDIRI

Telah diperiksa dan disetujui

No	INSTANSI	NAMA / JABATAN	TANDA TANGAN
1	Kontraktor Pelaksana CV. PUTRA SAGO MANDIRI	Diajukan Oleh : <u>ROSYID ABDULLOH AL AZIZ, S.T</u> Manager Proyek	
2	Konsultan Supervisi PT. PANDU SETYA PERSADA	Diperiksa Oleh : <u>ARIS SAPUTRA, S.T</u> Supervision Engineer	
3	Pihak Pengguna Jasa Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN KEPAHIANG	Disetujui Oleh : <u>Ir. HARDIONO, S.T., M.T</u> NIP. 19760902 201001 1 009	



PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHANG
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

PENGUJIAN ANALISA SARINGAN

Paket Pakaian = PENINGKATAN / REKONSTRUKSI JALAN SOSOKAN TABA - CINTO MANDI (LANJUTAN DBH 2024)
Kontraktor = CV. PUTRA SAGO MANDIRI
Konsultansi = PT. PANDU SETYA PERSADA


Jenis Contoh Uji = Agregat Kelas A
Metode Uji = SNI 03 - 1968 - 1990

Berat Contoh Kering : 10000 Gr

Berat Contoh Kering		Ukuran saringan						
Uraian		1 1/2"	1"	3/8"	# 4	# 10	# 40	# 200
Inci								
mm		37.5	25.0	9.50	4.75	2.0	0.425	0.075
Beral Individu		0.00	1628.00	2926.00	1501.00	1530.00	1405.00	618.00
Berat Kumulatif		0.00	1628.00	4554.00	6055.00	7585.00	8990.00	9608.00
Persen Tertahan		0.00	16.28	45.54	60.55	75.85	89.90	96.08
Persen Lolos		100.00	83.72	54.46	39.45	24.15	10.10	3.92

Spec.gradasi

Batas Atas (Max)	100.0	85.0	58.0	44.0	30.0	17.0	8.0
Batas Bawah (Min)	100.0	79.0	44.0	29.0	17.0	7.0	2.0

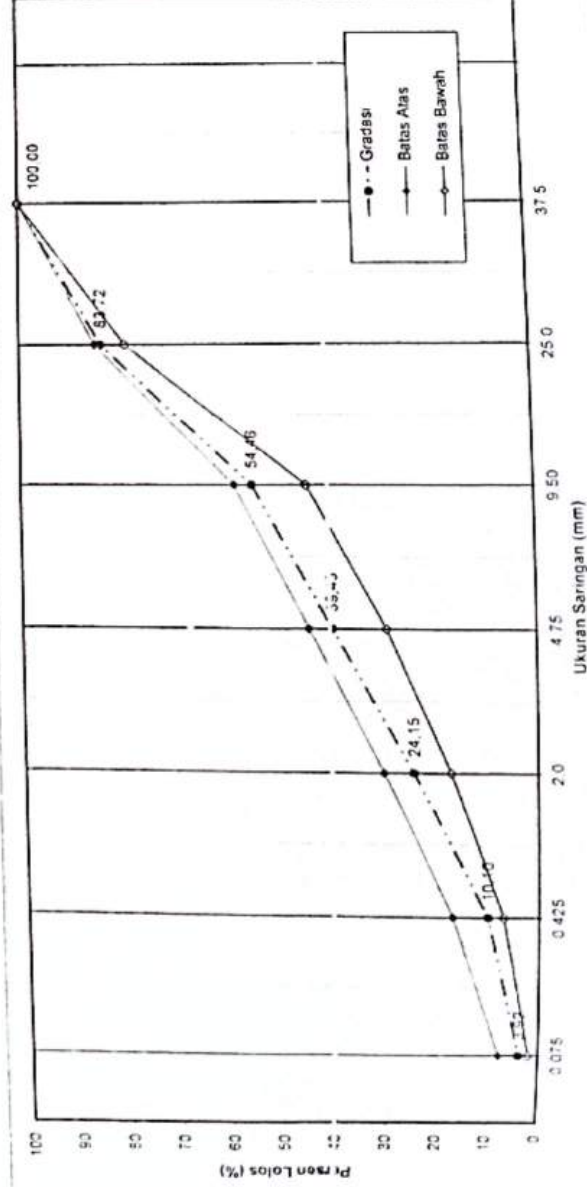

Disetujui Oleh :
Stiefi Kegiatan
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN KEPAHANG

Diperiksa Oleh :
Konsultansi Supervisi
PT. PANDU SETYA PERSADA

Dibuat Oleh :
Kontraktor Pelaksana
CV. PUTRA SAGO MANDIRI

Ir. ABDUL HAKIS, S.T., M.T.
NIP. 19810311 200604 1 007

DZULHAD AGAM R. ST
Inspector

NANDA MARENDA, A.Md
Petugas Laboratorium




PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHANG
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG**

Jln. Lintas Tebat Monok - Kelilik. KP. 39372. Kepahiang



**JOB MIX FORMULA
LAPIS RESAP PENGIKAT (PRIME COAT)**

**PENINGKATAN / REKONSTRUKSI
JALAN SUBSOKAN TAPA - CINTO
(MARET - AGUSTUS 2024)**

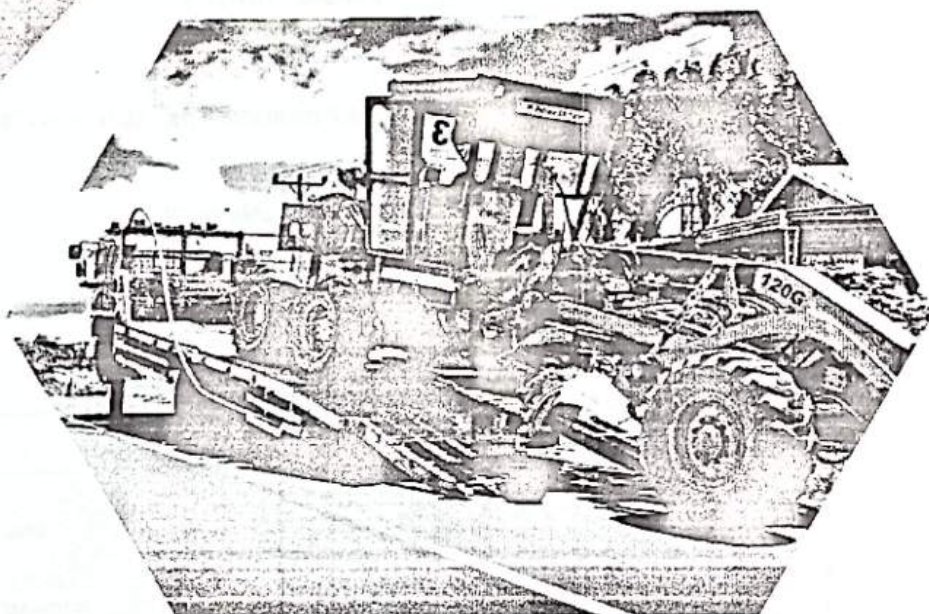

TAHUN ANGGARAN

2025



CV. PUTRA SAGO MANDIRI

Alamat Kantor : Jalan Aru Komplek Pemda No.238 RT.02 RW.05 Kel.
Lubuk Begalung Nan XX Kec. Lubuk Begalung Kota Padang

PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHIANG
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG



LEMBAR PENGESAHAN
JOB MIX FORMULA
PRIME COAT

PENINGKATAN / REKONSTRUKSI JALAN SOSOKAN TABA - CINTO MANDI (LANJUTAN DBH 2024)

Kontraktor Pelaksana
CV. PUTRA SAGO MANDIRI

Telah diperiksa dan disetujui

INSTANSI	NAMA / JABATAN	TANDA TANGAN
Kontraktor Pelaksana CV. PUTRA SAGO MANDIRI	Diajukan Oleh : <u>ROSYID ABDULLOH AL AZIZ, ST</u> Manager Proyek	
Konsultan Supervisi PT. PANDU SETYA PERSADA	Diperiksa Oleh : <u>ARIS SAPUTRA, S.T</u> Supervision Engineer	
Pihak Pengguna Jasa Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN KEPAHIANG	Disetujui Oleh : <u>Ir. HARDIONO, S.T., M.T</u> NIP. 19760902 201001 1 009	



PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHIANG
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

PRIME COAT

Paket Pekerjaan = PENINGKATAN / REKONSTRUKSI JALAN SOSOKAN TABA - CINTO MANDI (LANJUTAN DBH 2024)
Kontraktor = CV. PUTRA SAGO MANDIRI
Konsultan = PT. PANDU SETYA PERSADA

KOMPOSISI

I. BERAT JENIS

A. MINYAK TANAH = 0,79
B. ASPAL CURAH = 1,03

II. 85 BAGIAN MINYAK TANAH PER 100 BAGIAN ASPAL

A. MINYAK TANAH	=	$\frac{85}{185}$	x	100%	=	45,95%
B. ASPAL	=	$\frac{100}{185}$	x	100%	=	54,05%
TOTAL					=	100,00%

III. BERAT JENIS PRIME COAT

A. MINYAK TANAH	=	45,95%	x	0,79	=	0,365
B. ASPAL	=	54,05%	x	1,03	=	0,557
						0,922

MAKA BERAT JENIS PRIME COAT =

0,922

Disetujui Oleh :
Pengawas
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN KEPAHIANG

Ir. ABDUL HIRIS, S.T., M.T
NIP. 19810311 200604 1 007

Diperiksa Oleh :
Konsultan Supervisi
PT. PANDU SETYA PERSADA

DZULHAD AGAM R, ST
Inspector

Dibuat Oleh :
Kontraktor Pelaksana
CV. PUTRA SAGO MANDIRI

NANDA MARENDA, A.Md
Petugas Laboratorium



PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHIANG
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

TACK COAT

Paket Pekerjaan = PENINGKATAN / REKONSTRUKSI JALAN SOSOKAN TABA - CINTO MANDI (LANJUTAN DBH 2024)
Kontraktor = CV. PUTRA SAGO MANDIRI
Konsultan = PT. PANDU SETYA PERSADA

KOMPOSISI

I. BERAT JENIS

A MINYAK TANAH = 0,79
B ASPAL CURAH = 1,03

II. 30 BAGIAN MINYAK TANAH PER 100 BAGIAN ASPAL

A MINYAK TANAH	=	$\frac{30}{130}$	x	100%	=	23,08%
B ASPAL	=	$\frac{100}{130}$	x	100%	=	76,92%
TOTAL					=	100,00%

III. BERAT JENIS PRIME COAT

A MINYAK TANAH	=	23,08%	x	0,79	=	0,182
B ASPAL	=	76,92%	x	1,03	=	0,796
						0,978

MAKA BERAT JENIS PRIME COAT =

0,978

Disetujui Oleh :
Pengawas
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN KEPAHIANG

Ir. ABDUL HARRIS, S.T., M.I.
NIP. 19810311 200504 1 007

Diperiksa Oleh :
Konsultan Supervisi
PT. PANDU SETYA PERSADA

DZULHAD AGAM R. ST.
Inspector

Dibuat Oleh :
Kontraktor Pelaksana
CV. PUTRA SAGO MANDIRI

NANDA MARENDA, A.Mg.
Pelugas Laboratorium




PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHIANG
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG**

Jln. Lintas Tebat Monok - Kelilik. KP. 39372. Kepahiang



**JOB MIX FORMULA
BETON FC 15 Mpa**

**PENINGKATAN / REKONSTRUKSI
JALAN SOSOKAN TABA - CINTO
MANDI (LANJUTAN DDM 2024)**

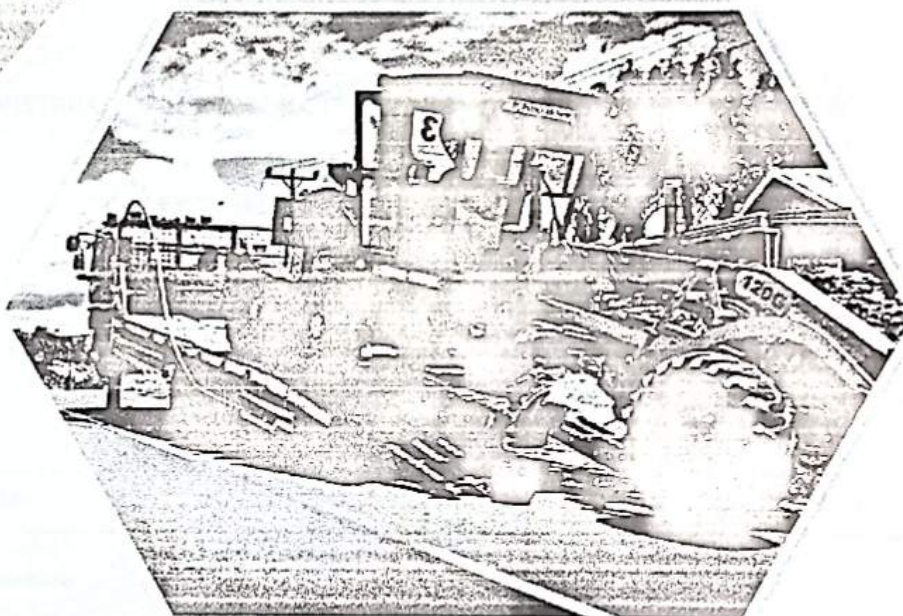

TAHUN ANGGARAN

2025



CV. PUTRA SAGO MANDIRI

Alamat Kantor : Jalan Aru Komplek Pemda No.238 RT.02 RW.05 Kel.
Lubuk Begalung Nan XX Kec. Lubuk Begalung Kota Padang

PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHANG
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG



LEMBAR PENGESAHAN
JOB MIX FORMULA
FC 15 Mpa

PENINGKATAN / REKONSTRUKSI JALAN SOSOKAN TABA - CINTO MANDI (LANJUTAN DBH 2024)

Kontraktor Pelaksana
CV. PUTRA SAGO MANDIRI

Telah diperiksa dan disetujui

No	INSTANSI	NAMA / JABATAN	TANDA TANGAN
1	Kontraktor Pelaksana CV. PUTRA SAGO MANDIRI	Diajukan Oleh : <u>ISMET KURNIAWAN</u> Direktur	
2	Konsultan Supervisi PT. PANDU SETYA PERSADA	Diperiksa Oleh : <u>ARIS SAPUTRA, ST</u> Supervision Engineer	
3	Pihak Pengguna Jasa Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN KEPAHANG	Disetujui Oleh : <u>Ir. HARDIONO, ST, MT</u> NIP : 19760902 201001 1 009	



DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN KEPAHANG

JMF BETON

KONTRAKTOR

CV. PUTRA SAGO MANDIRI

KONSULTAN

PT. PANDU SETYA PERSADA

PROJECT : PENINGKATAN / REKONSTRUKSI JALAN SOSOKAN TABA - CINTO MANDI (LANJUTAN DBH 2024)

CONCRETE CLASS : FC 15

Compressive of strength / 28 days : 15 Mpa
Slump Required : 10 ± 2 Cm
Cement type : PC Semen Padang

Description of material	Volumetric	Specific Gravity	Quantities Kg/M3 SSD Basis
Cement content	101.59	3.15	320
Water	134	1	134
Fine aggregate	311.95	2.519	786
Coarse aggregate	111.41	2.624	292
Coarse aggregate	319.38	2.607	833
Admixture VZ	1.28	1.18	1.51
Air content	20		
Volume 1 m3	1000		
Volume aggregate : 742.73	Concrete density :		2367

SUMMARY OF BATCH WEIGHT (SSD) PER CUBIC METRE OF CONCRETE

Cement Kg	Water Ltrs	Fine Aga Kg	Coarse Aga Kg		Admixture-Kg/M3		
			10-20	10-30	1	2	3
320	134	786	292	833	1.51		

Disetujui Oleh :
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN KEPAHANG

Ir. HARDIONO, ST, MT
NIP : 19760902 201001 1 009

Diperiksa Oleh :
Konsultan Supervisi
PT. PANDU SETYA PERSADA

ARIS SAPUTRA, ST
Supervision Engineer

Dibuat Oleh :
Kontraktor
CV. PUTRA SAGO MANDIRI

ROSYID ABDULLOH AL AZIZ, ST
Manager Proyek



DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN KEPAHIANG

ANALISA SARINGAN AGREGAT KASAR

KONTRAKTOR


CV. PUTRA SAGO MANDIRI

KONSULTAN

PT. PANDU SETYA PERSADA

Jenis Contoh Uji : Batu Pecah (1-3)
Metode Uji : SNI 03-2834-2000

Ukuran Saringan		Berat Sample : 2500 gram				Berat Sample : 2500 gram				Lolos Rata 2 Uji 1 & Uji 2 %
		Analisa Saringan		Jumlah %		Analisa Saringan		Jumlah %		
SNI	ASTM	Berat Tertahan	Kumulatif Berat Tertahan	Tertahan Kumulatif	Lolos Kumulatif	Berat Tertahan	Kumulatif Berat Tertahan	Tertahan Kumulatif	Lolos Kumulatif	
mm	mm	(gram)	(gram)	%	%	(gram)	(gram)	%	%	
1 1/2	37.5	0	0	0.00	100.00	0	0	0.00	100.00	100.00
3/4	19	1490	1490	59.60	40.40	1525	1525	61.00	39.00	39.70
3/8	9.5	382.5	1872.5	74.90	25.10	433.5	1958.5	78.34	21.66	23.38
No. 4	4.75	511	2383.5	95.34	4.66	479	2437.5	97.50	2.50	3.58

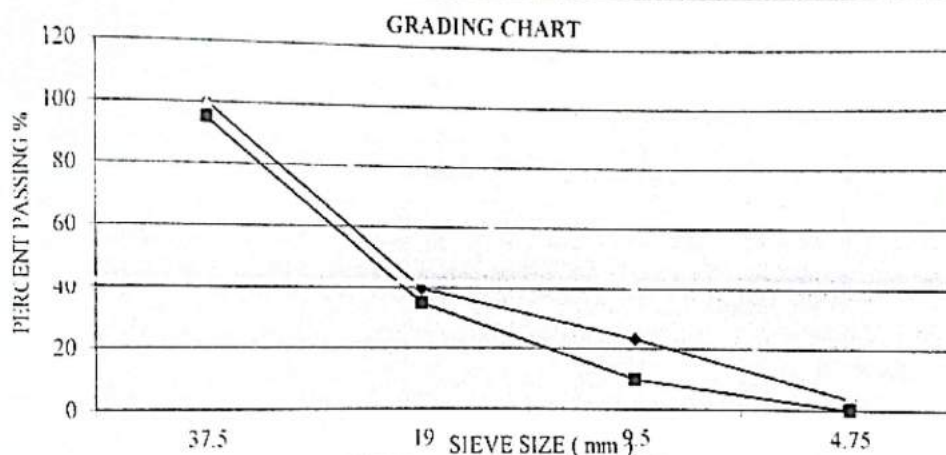

Disetujui Oleh :
STAFF KEGIATAN

DPUPR KAB. KEPAHIANG

Ir. ABDUL HAKIS, ST, MT

NIP : 19810311 200604 1 007

Diperiksa Oleh :
KONSULTAN SUPERVISI

PT. PANDU SETYA PERSADA

DZULHAD AGAM R, ST

Inspector

Dibuat Oleh :
KONTRAKTOR PELAKSANA

CV. PUTRA SAGO MANDIRI

NANDA MARENDA, A.Md

Petugas Laboratorium




PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHANG
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG**

Jln. Lintas Tebat Monok - Kelilik. KP. 39372, Kepahiang



**JOB MIX FORMULA
LASTON LAPIS ANTARA AC-BC**

**PENINGKATAN / REKONSTRUKSI
JALAN SESOIKAN TAGEA - CINTO
TAMBAHAN JUKATAN DEH 2024**

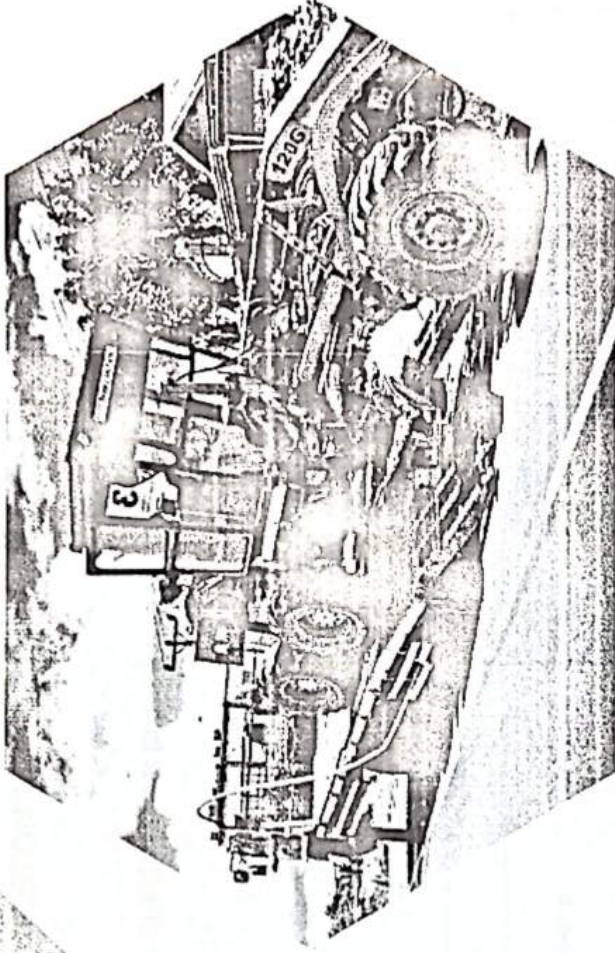

TAHUN ANGGARAN


2025



CV. PUTRA SAGO MANDIRI

Alamat Kantor : Jalan Aru Komplek Pemda No.238 RT.02 RW.05 Kel.
Lubuk Begalung Nan XX Kec. Lubuk Begalung Kota Padang

PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHIANG
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG



LEMBAR PENGESAHAN
JOB MIX FORMULA
LASTON LAPIS ANTARA (AC - BC)

PENINGKATAN / REKONSTRUKSI JALAN SOSOKAN TABA - CINTO MANDI (LANJUTAN DBH 2024)

Kontraktor Pelaksana
CV. PUTRA SAGO MANDIRI

Telah diperiksa dan disetujui

No	INSTANSI	NAMA / JABATAN	TANDA TANGAN
1	Kontraktor Pelaksana CV. PUTRA SAGO MANDIRI	Diajukan Oleh : <u>ROSYID ABDULLOH AL AZIZ. ST</u> <i>Manager Proyek</i>	
2	Konsultan Supervisi PT. PANDU SETYA PERSADA	Diperiksa Oleh : <u>ARIS SAPUTRA. ST</u> <i>Supervision Engineer</i>	
3	Pihak Pengguna Jasa Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN KEPAHIANG	Disetujui Oleh : <u>Ir. HARDIONO. S.T., M.T</u> NIP. 19760902 201001 1 009	



PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHIANG
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

SUMMARY JOB MIX FORMULA

Paket Pekerjaan = PENINGKATAN / REKONSTRUKSI JALAN SOSOKAN TABA - CINTO MANDI (LANJUTAN DDH 2024)
Kontraktor = CV. PUTRA SAGO MANDIRI
Konsultan = PT. PANDU SETYA PERSADA

I. KOMPOSISI CAMPURAN

NO	BIN DINGIN			BIN PANAS		
1	AGGREGAT KASAR	:	25 %	BIN PANAS I	:	46 %
2	AGGREGAT SEDANG	:	23 %	BIN PANAS II	:	18 %
3	AGGREGAT HALUS	:	50 %	BIN PANAS III	:	20 %
4	FILLER	:	2 %	BIN PANAS IV	:	14 %
5	ADDITIF	:	0,3 %	FILLER	:	2 %
				TOTAL	:	100 %


II. GRADASI CAMPURAN

NO	UKURAN SARINGAN	1 "	3/4 "	1/2 "	3/8 "	No. 4	No. 8	No. 16	No. 30	No. 50	No. 100	No. 200
1	BIN DINGIN	100,00	100,00	88,30	78,11	60,09	32,37	18,76	12,54	8,74	6,30	4,46
2	BIN PANAS	100,00	99,99	85,09	73,65	55,35	39,91	24,93	17,55	12,51	8,63	5,27
	SPEKIFIKASI	100,00	100 - 90	90 - 75	82 - 66	64 - 46	49 - 30	38 - 18	28 - 12	20 - 7	13 - 5	8 - 4


III. MARSHAL PROPERTIES

NO	SIFAT CAMPURAN		HASIL UJI	SPEKIFIKASI
1	STABILITAS MARSHALL	Kg	1004	Min 800 kg
2	KELELEHAN	mm	3,2	Min 2 - 4 mm
3	MARSHAL QUOTIENT	Kg/mm	343	Min 250
4	RONGGA UDARA DLM CAMPURAN (VIM)	%	4,40	3,0 - 5,0
5	RONGGA UDARA DLM AGGREGAT (VMA)	%	17,32	Min 14 %
6	RONGGA TERISI ASPAL (VFB)	%	76,48	Min 65 %
7	KADAR ASPAL CAMPURAN	%	5,50	-
8	KADAR ASPAL EFEKTIF	%	4,6	-
9	VIM REFUSAL	%	2,37	Min 2 %
10	KEPADATAN (BULK DENSITY)	Gr/cc	2,270	-
11	STABILITAS MARSHALL SISA 24 JAM	%	92,34	Min 90 %
12	RASIO PARTIKEL LOLOS AYAKAN 0,075 mm DENGAN KADAR ASPAL EFEKTIF	%	1,14	0,6 - 1,2

Disetujui Oleh
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN KEPAHIANG


Ir. HARDIONO, S.T., M.T.
NIP. 19760902 201001 1 009

Dipenka Oleh
Konsultan Supervisi
PT. PANDU SETYA PERSADA


ARIS SAPUTRA, S.T.
Supervision Engineer

Dibuat Oleh
Kontraktor Pelaksana
CV. PUTRA SAGO MANDIRI


ROSYID ABDULLAH AL AZIZ, S.T.
Manager Proyek



PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHIANG
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

DATA KALIBRASI COLDBIN AMP

Rencana campuran = 50 ton/jam
50000 kg/jam

Komposisi campuran :
koreksi KAO 5.50 %
CA 25.00 % 12.50 Ton/jam
MA 23.00 % 11.50 Ton/jam
FA 50.00 % 25.00 Ton/jam


Total 98.00 % 49.00 Ton/jam

A. Pengujian Dengan Cara Pengaturan Bukaan Pintu


Skala (CM)	Coldbin I = FA (kg/5 Detik)				Ton/Jam	Kg/mnt	Skala (CM)	Coldbin II = FA (kg/5 Detik)				Ton/Jam	Kg/mnt	Skala (CM)	Coldbin III = MA (kg/5 Detik)				Ton/Jam	Kg/mnt	Skala (CM)
	1	2	3	rata2				1	2	3	rata2				1	2	3	rata2			
5	35.05	30.90	28.52	31.86	22.937	382.284	5	12.50	13.32	12.31	12.71	9.150	152.508	5	10.79	10.21	9.83	10.28	123.300	7.398	5
10	72.50	64.42	72.25	69.72	50.203	836.720	10	32.05	32.30	31.25	32.07	23.688	384.792	10	23.10	23.35	23.93	23.48	231.760	16.908	10
15	95.01	99.04	99.28	99.41	70.855	1180.020	15	41.36	43.20	41.88	42.15	30.348	505.760	15	39.06	40.14	34.42	37.87	454.492	27.270	15

B. Grafik Pasokan Agregat


KALIBRASI BUKAAN COLDBIN I = FA (Abu - Batu)



KALIBRASI BUKAAN COLDBIN II = MA (0.5 - 1)



KALIBRASI BUKAAN COLDBIN III = CA (1 - 2)



Disetujui Oleh
Pengawas
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN KEPAHIANG

Ir. ABDUL HAKIS, S.T., M.T.
NIP. 19810311-00604 1 007

Diperiksa Oleh :
Konsultan Supervisi
PT. PANDU SETYA PERSADA

DZULHAD AGAM R. SI
Inspector

Dibuat Oleh :
Kontraktor Pelaksana
CV. PUTRA SAGO MANDIRI

NANDA MARENDIA, A.Md
Petugas Laboratorium




PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHANG
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG**

Jln. Lintas Tebat Monok - Kelilik. KP. 39372. Kepahiang



**JOB MIX FORMULA
LASTON LAPIS AUS AC-WC**

**PENINGKATAN KENDALITAN
JALAN DI KAWASAN KOTA**

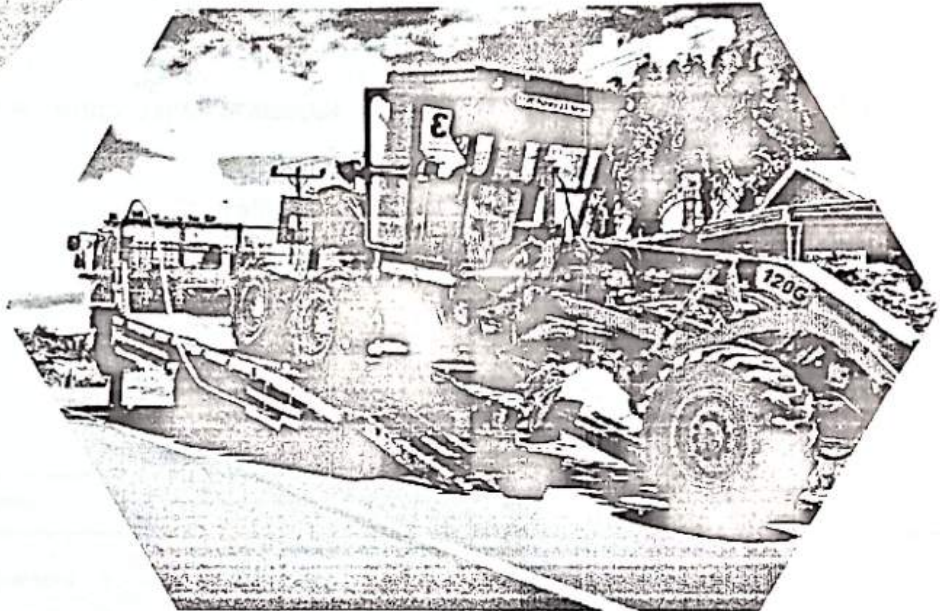

TAHUN ANGGARAN

2025



CV. PUTRA SAGO MANDIRI

Alamat Kantor : Jalan Aru Komplek Pemda No.238 RT.02 RW.05 Kel.
Lubuk Begalung Nan XX Kec. Lubuk Begalung Kota Padang

PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHIANG
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG



LEMBAR PENGESAHAN
JOB MIX FORMULA
AC - WC

PENINGKATAN / REKONSTRUKSI JALAN SOSOKAN TABA - CINTO MANDI (LANJUTAN DBH 2024)

Kontraktor Pelaksana
CV. PUTRA SAGO MANDIRI

Telah diperiksa dan disetujui

No	INSTANSI	NAMA / JABATAN	TANDA TANGAN
1	Kontraktor Pelaksana CV. PUTRA SAGO MANDIRI	Diajukan Oleh : <u>ROSYID ABDULLOH AL AZIZ, S.T</u> <i>Manager Proyek</i>	
2	Konsultan Supervisi PT. PANDU SETYA PERSADA	Diperiksa Oleh : <u>ARIS SAPUTRA, S.T</u> <i>Supervision Engineer</i>	
3	Pihak Pengguna Jasa Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN KEPAHIANG	Disetujui Oleh : <u>Ir. HARDIONO, S.T., M.T</u> <i>NIP. 19760902 201001 1 009</i>	



PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHIANG
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

SUMMARY JOB MIX FORMULA AC - WC

Paket Pekerjaan : PENINGKATAN / REKONSTRUKSI JALAN SOSOKAN TABA - CINTO MANDI (LANJUTAN DBH 2024)

Kontraktor : CV. PUTRA SAGO MANDIRI

Konsultan : PT. PANDU SETYA PERSADA

I. KOMPOSISI CAMPURAN

NO	BIN DINGIN	BIN PANAS
1	AGGREGAT KASAR : 16 %	BIN PANAS IV : 1 %
2	AGGREGAT SEDANG : 22 %	BIN PANAS III : 25 %
3	AGGREGAT HALUS : 60 %	BIN PANAS II : 22 %
4	FILLER : 2 %	BIN PANAS I : 50 %
5	ADDITIF : 0,3 %	FILLER : 2 %
		TOTAL : 100 %


II. GRADASI CAMPURAN

NO	UKURAN SARINGAN	3/4"	1/2"	3/8"	No. 4	No. 8	No. 16	No. 30	No. 50	No. 100	No. 200
1	BIN DINGIN	100,00	91,58	87,31	64,40	41,40	28,45	20,76	15,38	10,96	6,40
2	BIN PANAS	100,00	92,30	79,58	66,63	49,45	33,95	22,74	15,64	8,35	5,07
	SPEKIFIKASI	100,00	90 - 100	77 - 90	53 - 69	33 - 53	21 - 40	14 - 30	9 - 22	6 - 15	4 - 9


III. MARSHAL PROPERTIES

NO	SIFAT CAMPURAN		HASIL UJI	SPEKIFIKASI
1	STABILITAS MARSHALL	Kg	1007	Min 800 kg
2	KELELEHAN	mm	3,2	Min 2 - 4 mm
3	MARSHAL QUOTIENT	Kg/mm	314,3	Min 250
4	RONGGA UDARA DLM CAMPURAN (VIM)	%	4,50	3,0 - 5,0
5	RONGGA UDARA DLM AGGREGAT (VMA)	%	17,9	Min 15 %
6	RONGGA TERISI ASPAL (VFB)	%	74,89	Min 65 %
7	KADAR ASPAL CAMPURAN	%	5,80	-
8	KADAR ASPAL EFEKTIF	%	4,5	-
9	VIM REFUSAL	%	2,41	Min 2
10	KEPADATAN (BULK DENSITY)	Gr/cc	2,260	-
11	STABILITAS MARSHALL SISA 24 JAM	%	94,42	Min 90 %
12	RASIO PARTIKEL LOLOS AYAKAN 0,075 mm DENGAN KADAR ASPAL EFEKTIF	%	1,14	0.6 - 1.2


Disetujui Oleh :
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN KEPAHIANG


Ir. HARBIONO, S.T., M.T.
NIP. 19760902 201001 1 009

Disetujui
Konsultan Supervisi
PT. PANDU SETYA PERSADA


ARIS SAPUTRA, S.T.
Supervision Engineer

Dibuat Oleh :
Kontraktor Pelaksana
CV. PUTRA SAGO MANDIRI


ROSYID ABDULLOH AL AZIZ, S.T.
Manager Proyek



PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHANG
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

DATA KALIBRASI COLDBIN AMP

Rencana campuran	50	ton/jam
	50000	kg/jam
Komposisi campuran		
korksi KAO	5,80 %	
CA	16,00 %	8,00 Ton/jam
MA	22,00 %	11,00 Ton/jam
FA	60,00 %	30,00 Ton/jam
Total	98,00 %	49,00 Ton/jam


A. Pengujian Dengan Cara Pengaturan Bukaannya Pintu

Skala (CM)	Coldbin I = FA(kg)/5 Detik				Kg/mnt	Ton/Jam
	1	2	3	rata2		
5	36,05	30,90	28,62	31,86	382,284	22,937
10	72,50	64,42	72,26	69,73	836,720	50,203
15	96,01	99,94	99,28	98,41	1180,920	70,855

Skala (CM)	Coldbin II = MA (kg)/5 Detik				Kg/mnt	Ton/Jam
	1	2	3	rata2		
5	12,50	13,32	12,31	12,71	152,508	9,150
10	32,65	32,30	31,25	32,07	384,792	23,088
15	41,36	43,20	41,88	42,15	505,750	30,346


Skala (CM)	Coldbin III = CA (kg)/5 Detik				Kg/mnt	Ton/Jam
	1	2	3	rata2		
5	10,79	10,21	9,83	10,28	123,300	7,398
10	23,10	23,35	23,99	23,48	281,760	16,906
15	39,06	40,14	34,42	37,87	454,492	27,270

B. Grafik Pasokan Agregat

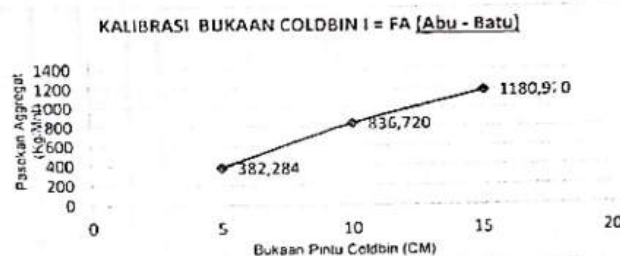


Disetujui Oleh :
Pengawas
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN KEPAHANG

Ir. ABDUL HAFIS, S.T., M.T
NIP. 19810311 00604 1 007

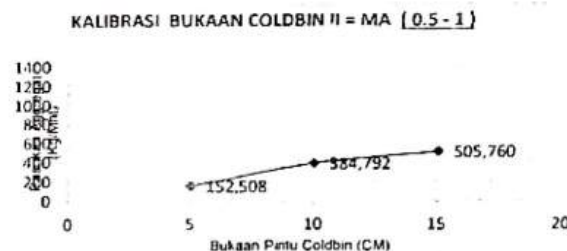

Diperiksa Oleh :
Konsultan Supervisi
PT. PANDU SETYA PERSADA

DZULHAD AGAM R. ST
Inspector

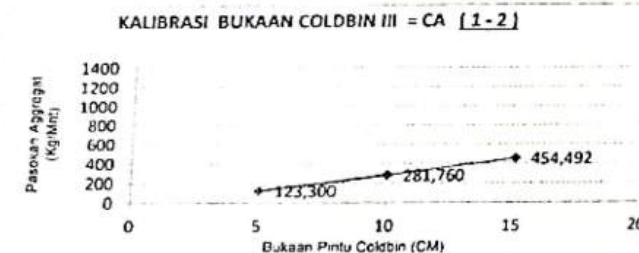

Dibuat Oleh :
Kontraktor Pelaksana
CV. PUTRA SAGOMANDIRI

NANDA MARENDA, A.Md
Petugas Laboratorium




PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHANG
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG**

Jln. Lintas Tebat Monok - Kelilik, KP. 39372, Kepahiang



BACKUP DATA

**PENINGKATAN / REKONSTRUKSI
JALAN SOSOKAN TABA - CINTO
MANDI (LANJUTAN DBH 2024)**

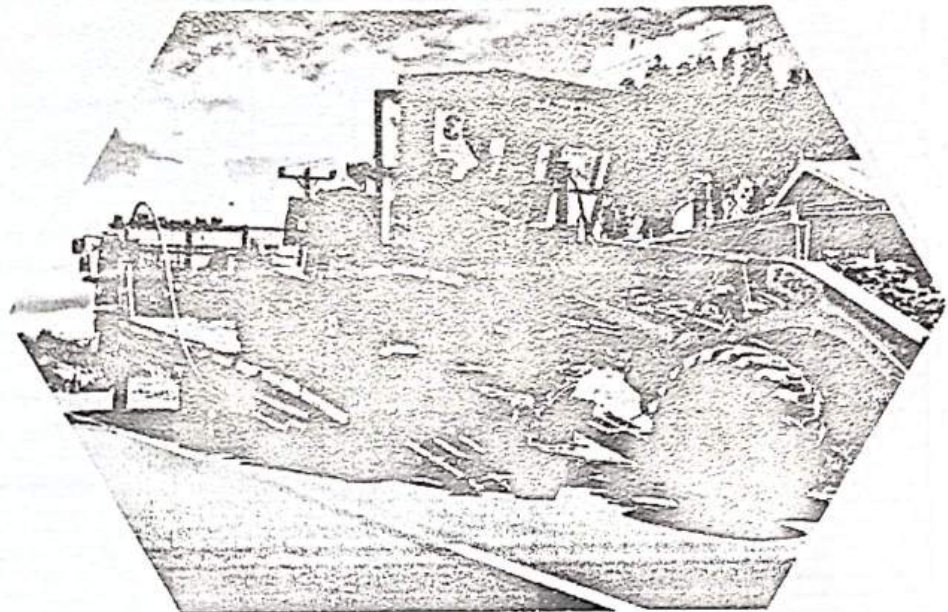

TAHUN ANGGARAN

2024



CV. PUTRA SAGO MANDIRI

Alamat Kantor : Jalan Aru Komplek Pemda No.238 RT.02 RW.05 Kel.
Lubuk Begalung Nan XX Kec. Lubuk Begalung Kota Padang

Pekerjaan : Peningkatan/Rekonstruksi Jalan Bosokan Tabu - Cinto Mar
Prov / Kab : Bengkulu / Kepahiang
Tahun Anggaran : 2025
Kontrak : 600.1.7/157/KONTRUKDUPUPR/2025
Tanggal Kontrak : 29 Agustus 2025
Waktu Pelaksanaan : 90 (Sembilan Puluh) Hari Kalender

NO. MATA PEMBAYARAN	URAIAN	JAMBAH KURANG			KET
		PEKERJAAN TAMBAH	KUANTITAS	JUMLAH HARGA (Rp)	BOBOT (%)
	DIVISI 1. UMUM		-	-	-
1.2	Mobilisasi		-	-	-
1.2 (1)	Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas		-	-	-
SKN-1.1.22 (1a)	Pembuatan dokumen RKK, RMPK, RKPP, dan RMLP		-	-	-
SKN-1.1.22 (1b)	Pembuatan prosedur dan instruksi kerja		-	-	-
SKN-1.1.22 (1c)	Penyusunan pelaporan penerapan SMK		-	-	-
	Sub Total Penyusunan dokumen penerapan SMK		-	-	-
	Alat Pelindung Diri		-	-	-
SKN-1.1.22 (3b1)	Topi pelindung (Safety Helmet)		-	-	-
SKN-1.1.22 (3b2)	Pelindung mata (Goggles, Spectacles)		-	-	-
SKN-1.1.22 (3b6)	Pelindung pernafasan dan mulut (masker, masker respirator)		-	-	-
SKN-1.1.22 (3b7)	Sarung tangan (Safety Gloves)		-	-	-
SKN-1.1.22 (3b8)	Sepatu keselamatan (Safety Shoes, rubber safety shoes and toe cap)		-	-	-
SKN-1.1.22 (3b11)	Rompel keselamatan (Safety Vest)		-	-	-
	Sub Total Alat Pelindung Diri		-	-	-
SKN-1.1.22 (4a)	Akurasi dan Perizinan terkait Keselamatan Konstruksi		-	-	-
	Akurasi (Construction All Risk/CAR)		-	-	-
	Sub Total Akurasi dan Perizinan terkait Keselamatan Konstruksi		-	-	-
SKN-1.1.22 (5c)	Personel Keselamatan Konstruksi		-	-	-
SKN-1.1.22 (5h)	Petugas Keselamatan Konstruksi, Petugas K3		-	-	-
	Sub Total Personel Keselamatan Konstruksi		-	-	-
SKN-1.1.22 (6a)	Fasilitas sarana, prasana, dan alat kesehatan		-	-	-
	Peralatan P3K		-	-	-
	Sub Total Fasilitas sarana, prasana, dan alat kesehatan		-	-	-
SKN-1.1.22 (7a)	Rambu dan Penempatan lalu lintas yang diperlukan atau manajemen la		-	-	-
SKN-1.1.22 (7c)	Rambu petunjuk		-	-	-
SKN-1.1.22 (7d)	Rambu peringatan		-	-	-
SKN-1.1.22 (7e)	Rambu informasi		-	-	-
SKN-1.1.22 (7h)	Kerucut lalu lintas (traffic cone)		-	-	-
	Sub Total Rambu dan Penempatan lalu lintas yang diperlukan atau man		-	-	-
SKN-1.1.22 (9a1)	Kegiatan dan peralatan terkait Pengendalian Risiko Keselamatan Konstr		-	-	-
SKN-1.1.22 (9a4)	Alat Pemadam Api Ringan (APAR)		-	-	-
	Sub Total Kegiatan dan peralatan terkait Pengendalian Risiko Keselamat		-	-	-
1.21	Manajemen Mutu		-	-	-
	Jumlah Harga Pekerjaan Divisi I (masuk pada Rekapitulasi		-	-	-
3.2 (2a)	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK		312.90	2.759.849.97	0.25
3.3 (1)	Timbunan Pilihan dari Sumber Galian		-	2.759.849.97	-
	Pembiayaan Badan Jalan		-	-	-
	Jumlah Harga Pekerjaan Divisi III (masuk pada Rekapitulasi		-	-	-
5.1 (1)	DIVISI 5. PERKERASAN BERKUTIR DAN PERKERASAN BETON SE		30.28	31.585.557.63	2.81
	Lapis Pondasi Agregat Kelas A		-	31.585.557.63	-
	Jumlah Harga Pekerjaan Divisi V (masuk pada Rekapitulasi		-	-	-
	DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL		201.90	4.254.693.21	0.38
6.1 (1)	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi		-	-	-
6.1 (2) (a)	Lapis Perkuat - Aspal Cair/Emulsi		13.25	25.412.664.58	2.26
6.3 (5a)	Leston Lapis Atas (AC-WC)		15.87	29.583.919.60	2.63
6.3 (5a)	Leston Lapis Atas (AC-WC)		30.74	2.459.200.00	0.22
6.3 (5a)	Leston Lapis Atas (AC-WC)		-	61.710.477.58	-
	Jumlah Harga Pekerjaan Divisi VII (masuk pada Rekapitulasi		-	-	-
7.1 (8)	DIVISI 7. STRUKTUR		2	-	-
	Beton f'c 15 Mpa		-	-	-
	Jumlah Harga Pekerjaan Divisi VII (masuk pada Rekapitulasi		-	-	-
9.2 (1)	DIVISI 9. PEKERJAAN HARIAN		10.80	2.392.044.37	0.21
	Mantap Jalan Termoplastik		-	2.392.044.37	-
	Jumlah Harga Pekerjaan Divisi VII (masuk pada Rekapitulasi		-	-	-
	Jumlah Harga Pekerjaan Divisi VII (masuk pada Rekapitulasi		15	98.447.929.55	8.75
(A)	Jumlah Harga Pekerjaan (Termasuk Biaya Umum dan Keuntungan)		-	-	-
(B)	PPN 11%		-	-	-
(C)	Total + PPN ((A) + (B))		-	-	-
(D)	DIBULATKAN		-	-	-

TK)
IG

Dipenka Oleh :
Konsultan Pengawas
PT. PANDU SATYA PERKASA


ARIS SAPUTRA, S.T.
Supervision Engineer

Dibuat Oleh :
Kontraktor Pelaksana
CV. PUTRA SAGO MANDIRI


ROSYID ABDULLOH AL AZIZ, ST
Manajer Proyek

Revisi: 1.0 | Jalan Sengkang Teras - Ciri Manti (Langkapan DBH 2024)

Penyakit / Keperawatan

Per

2025
SAGO MANDIRI

CV PUTRA SATYA PERKASA

17.1(3)
16 Mpa (Bahu Jalan)

[illegible]

Pengawas
DUPPI KAB. KEPAHANG

Konsultan Pengawas
PT. PANDU SATYA PERKASA

Kontraktor Pelaksana
CV. PUTRA SAGO MANDIRI

Mr. ABDOUL KRIS, S.T., M.T
NIP 19810317 200604 1007


DZHULHAD AGAM R, ST
Inspector

RAZHARDIANTO, ST
PELAKSARI




PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHANG
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG**

Jln. Lintas Tebat Monok - Kelilik, KP. 39372, Kepahiang



BACKUP DATA QUANTITY

**PENINGKATAN / REKONSTRUKSI
JALAN SOSOKAN TABA - CINTO
MANDI (LANJUTAN DGN 2024)**



TAHUN ANGGARAN

2025




CV. PUTRA SAGO MANDIRI

Alamat Kantor : Jalan Aru Komplek Pemda No.238 RT.02 RW.05 Kel.
Lubuk Begalung Nan XX Kec. Lubuk Begalung Kota Padang

Pekerjaan : Peningkatan/Rekonstruksi Jalan Sosokan Taba - Cinto Mandi
Prov / Kab : Bengkulu / Kepahiang
Tahun Anggaran : 2025
Kontrak : 600 1 7/157/KNTRK/DPUPUPR/2025
Tanggal Kontrak : 29 Agustus 2025
Waktu Pelaksanaan : 90 (Sembilan Puluh) Hari Kalender

		MBAH KURANG			KET
NO. MATA PEMBAYARAN	URAIAN	PEKERJAAN TAMBAH			
		KUANTITAS	JUMLAH HARGA (Rp)	BOBOT (%)	
	DIVISI 1. UMUM	-	-	-	
1.2	Mobilisasi	-	-	-	
1.8 (1)	Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas	-	-	-	
	Penyiapan dokumen penerapan SMK	-	-	-	
SKh-1.1.22 (1a)	Pembuatan dokumen RKK, RMPK, RKPP, dan RMLP	-	-	-	
SKh-1.1.22 (1b)	Pembuatan prosedur dan instruksi kerja	-	-	-	
SKh-1.1.22 (1c)	Penyusunan pelaporan penerapan SMK	-	-	-	
	Sub Total Penyiapan dokumen penerapan SMK	-	-	-	
	Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri	-	-	-	
	APD	-	-	-	
SKh-1.1.22 (3b1)	Topi pelindung (Safety Helmet)	-	-	-	
SKh-1.1.22 (3b2)	Pelindung mata (Goggles, Spectacles)	-	-	-	
SKh-1.1.22 (3b6)	Pelindung pernafasan dan mulut (masker, masker respirator)	-	-	-	
SKh-1.1.22 (3b7)	Sarung tangan (Safety Gloves)	-	-	-	
SKh-1.1.22 (3b8)	Sepatu keselamatan (Safety Shoes, rubber safety shoes and toe cap)	-	-	-	
SKh-1.1.22 (3b11)	Rompi keselamatan (Safety Vest)	-	-	-	
	Sub Total Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri	-	-	-	
	Asuransi dan Perizinan terkait Keselamatan Konstruksi	-	-	-	
SKh-1.1.22 (4a)	Asuransi (Construction All Risk/CAR)	-	-	-	
	Sub Total Asuransi dan Perizinan terkait Keselamatan Konstruksi	-	-	-	
	Personel Keselamatan Konstruksi	-	-	-	
SKh-1.1.22 (5c)	Petugas Keselamatan Konstruksi, Petugas K3	-	-	-	
SKh-1.1.22 (5c)	Petugas pengatur lalu lintas	-	-	-	
	Sub Total Personel Keselamatan Konstruksi	-	-	-	
	Fasilitas sarana, prasarana, dan alat kesehatan	-	-	-	
SKh-1.1.22 (6a)	Peralatan P3K	-	-	-	
	Sub Total Fasilitas sarana, prasarana, dan alat kesehatan	-	-	-	
	Rambu dan Perlengkapan lalu lintas yang diperlukan atau manajemen lalu l	-	-	-	
SKh-1.1.22 (7a)	Rambu petunjuk	-	-	-	
SKh-1.1.22 (7c)	Rambu peringatan	-	-	-	
SKh-1.1.22 (7e)	Rambu informasi	-	-	-	
SKh-1.1.22 (7h)	Kerucut lalu lintas (traffic cone)	-	-	-	
	Sub Total Rambu dan Perlengkapan lalu lintas yang diperlukan atau manaj	-	-	-	
	Kegiatan dan peralatan terkait Pengendalian Risiko Keselamatan Konstruksi	-	-	-	
SKh-1.1.22 (9a1)	Alat Pemadam Api Ringan (APAR)	-	-	-	
SKh-1.1.22 (9a4)	Bendera K3	-	-	-	
	Sub Total Kegiatan dan peralatan terkait Pengendalian Risiko Keselamatan	-	-	-	
1.21	Manajemen Mutu	-	-	-	
	Jumlah Harga Pekerjaan Divisi I (masuk pada Rekapitulasi I)	-	-	-	
	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK	-	-	-	
3.2 (2a)	Timbunan Pilihan dari Sumber Galian	320,74	2.829.000,57	0,25	
3.3 (1)	Penyiapan Badan Jalan	-	2.829.000,57	-	
	Jumlah Harga Pekerjaan Divisi III (masuk pada Rekapitulasi I)	-	-	-	
	DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON SEME	31,36	32.712.123,09	2,91	
5.1 (1)	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	-	32.712.123,09	-	
	Jumlah Harga Pekerjaan Divisi V (masuk pada Rekapitulasi I)	-	-	-	
	DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL	209,14	4.407.263,89	0,39	
6.1 (1)	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi	-	-	-	
6.1 (2) (a)	Lapis Perkerai - Aspal Cair/Emulsi	13,56	26.007.419,06	2,31	
6.3 (5a)	Laston Lapis Atas (AC-WC)	15,06	28.070.360,74	2,50	
6.3 (5a)	Laston Lapis Bawah (AC-BC)	30,85	2.452.000,00	0,22	
6.3 (5)	Bahan Anti Pengelupasan	-	60.837.063,42	-	
	Jumlah Harga Pekerjaan Divisi VI (masuk pada Rekapitulasi I)	-	-	-	
	DIVISI 7. STRUKTUR	-	-	-	
7.1 (5)	Beton fc' 15 Mpa	-	-	-	
	Jumlah Harga Pekerjaan Divisi VII (masuk pada Rekapitulasi I)	-	-	-	
	DIVISI 9. PEKERJAAN HARIAN	10,80	2.392.044,37	0,21	
9.2 (1)	Marka Jalan Termoplastik	-	2.392.044,37	-	
	Jumlah Harga Pekerjaan Divisi VII (masuk pada Rekapitulasi I)	-	-	-	
		-	98.876.231,82	8,79	
(A)	Jumlah				
(B)	PPN 11%				
(C)	Total + PPN ((A) + (B))				
(D)	DIBULATKAN				

Diperiksa Oleh :
Konsultan Pengawas
PT. PANDU SATYA PERKASA


ARIS SAPUTRA, S.T.
Supervisor Engineer

Dibuat Oleh :
Kontraktor Pelaksana
CV. PUTRA SAGO MANDIRI


ROSYID ABDULLOH AL AZIZ, ST
Manajer Proyek

BACK UP DATA

Peningkatan/Rekonstruksi Jalan Sosokan Taba - Cinto Mandi (Lanjutan DBH 2024)
Bengkulu / kepahiang
2024
CV PUTRA SAGO MANDIRI
PT. PANDU SATYA PERKASA

Item : 9.2
Jalan : Marka Jalan Thermoplastik
Gambar

STA	R/L	Panjang (m')	Lebar	Koef	Volume (m2)	Ket
0+000.00	R	370.00	0.12	1.00	44.40	MENERUS
0+000.00	L	370.00	0.12	1.00	44.40	MENERUS
JUMLAH					88.80	
JUMLAH KUMULATIF S/D HAL INI					88.80	

Pengawas
PUPR KAB.KEPAHIANG
Konsultan Pengawas
PT. PANDU SATYA PERKASA
Kontaktor Pelaksana
CV. PUTRA SAGO MANDIRI

ABDUL HARISS, S.T., M.T
NIP. 19810311 200604 1007

DZULHADWAGAM R,ST
Inspector

RAZI HARDINANTO, ST
Pelaksana



PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHANG
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG**

Jln. Lintas Tebat Monok - Kelilik. KP. 39372. Kepahiang




JOB MIX FORMULA

TIMBUNAN PILIHAN DARI SUMBER GALIAN

PERINGATAN REKONSTRUKSI

REKONSTRUKSI JALAN KOTA PADANG

REKONSTRUKSI JALAN KOTA PADANG

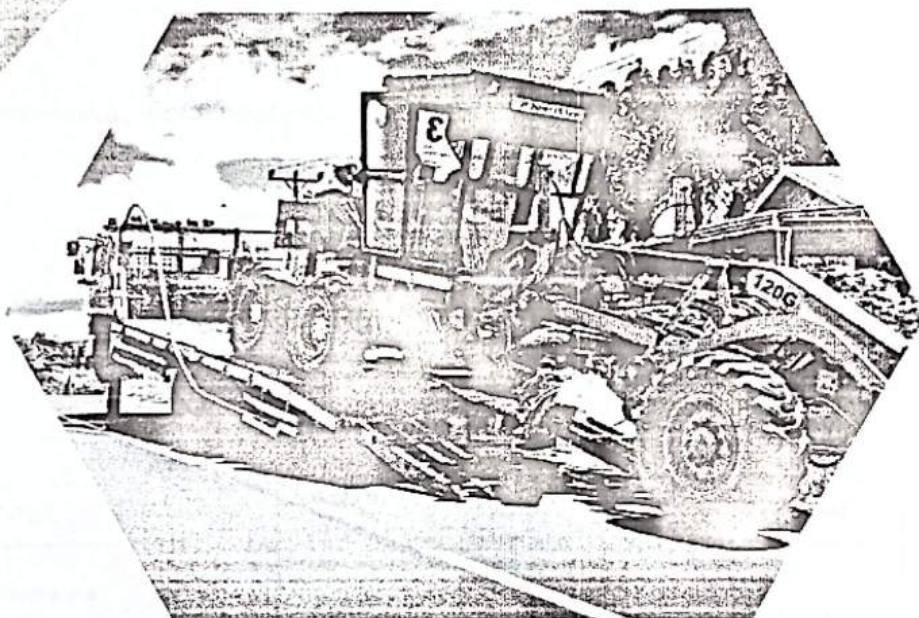

TAHUN ANGGARAN


2025



CV. PUTRA SAGO MANDIRI

Alamat Kantor : Jalan Aru Komplek Pemda No.238 RT.02 RW.05 Kel.
Lubuk Begalung Nan XX Kec. Lubuk Begalung Kota Padang

PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHANG
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG



LEMBAR PENGESAHAN
JOB MIX FORMULA
TIMBUNAN PILIHAN

PENINGKATAN / REKONSTRUKSI JALAN SOSOKAN TABA - CINTO MANDI (LANJUTAN DBH 2024)

Kontraktor Pelaksana
CV. PUTRA SAGO MANDIRI

Telah diperiksa dan disetujui

No	INSTANSI	NAMA / JABATAN	TANDA TANGAN
1	Kontraktor Pelaksana CV. PUTRA SAGO MANDIRI	Diajukan Oleh : <u>ROSYID ABDULLOH AL AZIZ, S.T</u> Manager Proyek	
2	Konsultan Supervisi PT. PANDU SETYA PERSADA	Diperiksa Oleh : <u>ARIS SAPUTRA, S.T</u> Supervision Engineer	
3	Pihak Pengguna Jasa Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN KEPAHANG	Disetujui Oleh : <u>Ir. HARDIONO, S.T., M.T</u> N/PP. 19760902 201001 1 009	



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHIANG
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Paket Pekerjaan = PENINGKATAN / REKONSTRUKSI JALAN SUSUKAN TABA - CINTO MANDI (LANJUTAN DBH 2024)
Kontraktor = CV. PUTRA SAGO MANDIRI
Konsultan = PT. PANDU SETYA PERSADA

REKAPITULASI HASIL UJI MATERIAL TIMBUNAN PILIHAN

I. GRADASI LAPIS PONDASI AGREGAT (% LOLOS)

Ukuran Ayakan	Inci	4"	# 4	# 200
	mm	100	4,75	0,075
Hasil Uji		100,00	38,32	2,15
Spesifikasi		100	90 - 25	10 - 0

II. SIFAT - SIFAT LAPIS PONDASI AGREGAT

No	Sifat - Sifat	Hasil Uji	Spesifikasi
1	Abrasi dari Agregat Kasar (SNI 2417 : 2008)	23,80	0 - 40 %
2	Y D maksimum	2,03	-
3	Kadar Air Optimum (W. Opt)	7,0	-
4	CBR rendaman (SNI 1744 : 2012)	50,03	Min. 10 %

Disetujui Oleh :
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN KEPAHIANG


Ir. HARDIONO, S.T., M.T
NIP. 19760902 201001 1 009

Diperiksa Oleh :
Konsultan Supervisi
PT. PANDU SETYA PERSADA


ARIS SAPUTRA, S.T
Supervision Engineer

Dibuat Oleh :
Kontraktor Pelaksana
CV. PUTRA SAGO MANDIRI


ROSYID ABDULLOH AL AZIZ, S.T
Manager Proyek



PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHANG
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG


PENGUJIAN ANALISA SARINGAN

Paket Pekerjaan = PENINGKATAN / REKONSTRUKSI JALAN SOSOKAN TABA - CINTO MANDI (LANJUTAN DBH 2024)
Kontraktor = CV. PUTRA SAGO MANDIRI
Konsultansi = PT. PANDU SETYA PERSADA

Jenis Contoh Uj = Timbunan Pilihan
Metode Uji = SNI 03 - 1068 - 1990

Berat Contoh Kering : 10000 Gr		Ukuran saringan		
Urutan				
Inci	4"	# 4	# 200	
mm	100	4,75	0,075	
Berat Individu	0,00	6168,00	3617,00	
Berat Kumulatif	0,00	6168,00	9785,00	
Persen Terahan	0,00	61,68	97,85	
Persen Lolos	100,00	38,32	2,15	

Spec.gradasi				
Batas Atas (Max)	100,0	90,0	10,0	
Batas Bawah (Min)	100,0	25,0	0,0	

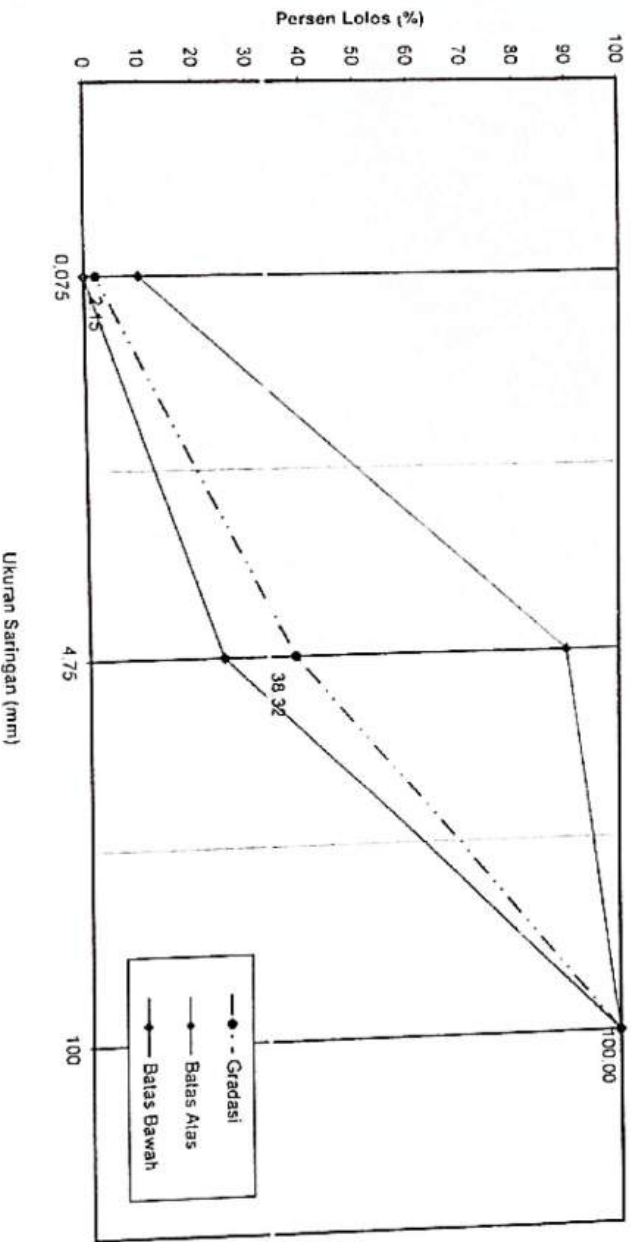

Ditetapkan Oleh :
Staf Kegiatan
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN KEPAHANG

Diperiksa Oleh :
Konsultansi Supervisor
PT. PANDU SETYA PERSADA

Dibuat Oleh :
Kontraktor Pelaksana
CV. PUTRA SAGO MANDIRI

Ir. ABDUL HARRIS, S.T., M.T.
NIP. 198103112006041007

DZULHAD AGAM R. ST
Inspector

NANDA MARENDA, A.Md
Petugas Laboratorium

PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHANG
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
BIDANG BINA MARGA

Alamat : Jln. Baru Desa Tebat Monok Kelilik Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang



ASBUILT DRAWING

**PENINGKATAN/REKONSTRUKSI JALAN
SOSOKAN TABA - CINTO MANDI
(LANJUTAN DBH 2024)
TA.2025**

PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHANG

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

BIDANG BINA MARGA

Alamat : Jln. Baru Desa Tebat Monok Kelilik Kcc. Kepahiang Kab. Kepahiang



LEMBAR PENGESAHAN

**PENINGKATAN/REKONSTRUKSI JALAN SOSOKAN TABA - CINTO MANDI
(LANJUTAN DBH 2024)**

TA.2025


DIKETAKUI OLEH :
PENGGUNA ANGGARAN
DINAS PUPR KAB.KEPAHIANG BIDANG BINA MARGA

DISETUJUI OLEH :

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
DINAS PUPR KAB.KEPAHIANG BIDANG BINA MARGA

DIPERIKSA OLEH :
KONSULTAN SUPERVISI
PT.PANDU SATYA PERKASA

DIBUAT OLEH :
KONTRAKTOR PELAKSANA
CV.PUTRA SAGO MANDIRI


TEDDY ADEBA, ST, ME
Nip : 19801006 2005021003


Ir. HARDIONO, ST, M.T
Nip : 197609022010011009


ARIS SAPUTRA, S.T
Supervision Engineer


ROSYID ABDULLOH AL AZIZ, ST
Manager Proyek

Pemerintah Kabupaten Kepulauan
Tengah Sulawesi
Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kendari, Sulawesi Tenggara

ASBUILT
DRAWING

PAKET PEKERJAAN :

PENINGKATAN/REKONSTRUKSI JALAN
SOSOKAN TABA - CINTO MANDI
(LANJUTAN DBH 2024)

RUAS :

SOSOKAN TABA - CINTO MANDI

JUDUL GAMBAR

DIAGRAM PENANGANAN

DISETUJUT OLEH :

DINAS PUPR KABUPATEN



Ir. ABDUL RASIS, S.T., MT
NIP. 198101112006041007

DIPERIKSA OLEH :

PT. PANDU SATYA PERKASA



DZULHID AGAM R. ST

DIBUAT OLEH :

CV. PUTRA SAGO MANDIRI



RAZI HARDIANTO, ST
PEJABEN

CATATAN :


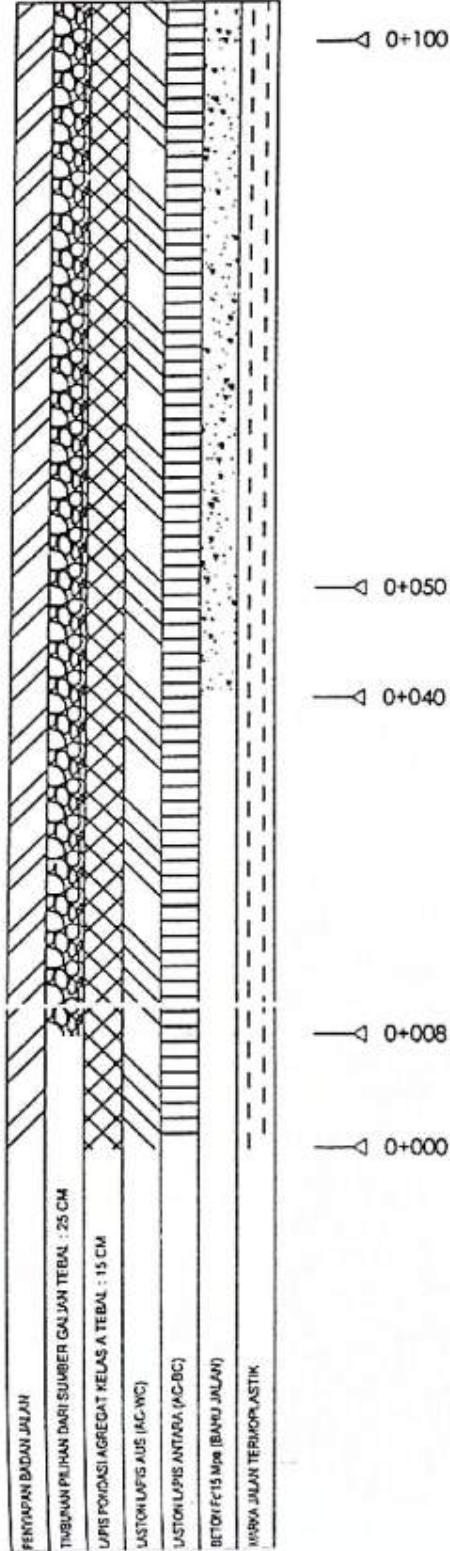


DIAGRAM PENANGANAN



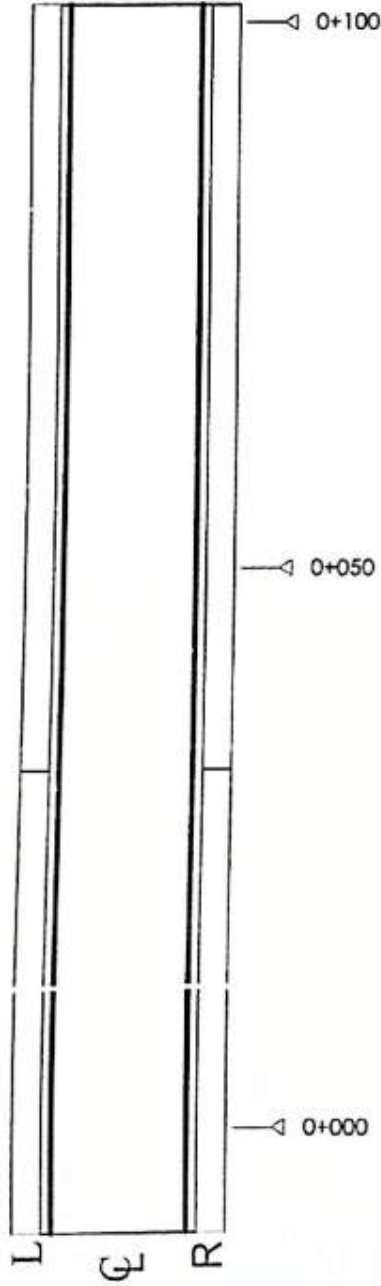

LEGENDA

	LASTON LAPIS AUS AC-WC		LAPIS PONDASI AGREGAT KELAS A		BETON FC 15 Mpa
	LASTON LAPIS ANTARA AC-BC		TIMBUNAN PILIHAN SUMI'ER GALIAN		PASANGAN BATU DENGAN MORTAR

PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHANG
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Jalan. Di Kota Baru Kota Baru Kota Baru Kota Baru Kota Baru Kota Baru

ASBUILT DRAWING

PAKET PEKERJAAN :

PENINGKATAN/REKONSTRUKSI JALAN SOSOKAN
TABA - CINTO MANDI
(LANUTAN DBH 2024)

RUAS :

SOSOKAN TABA - CINTO MANDI

JUDUL GAMBAR

TYPICAL JALAN

DISETUJUI OLEH :

Program
DINAS PUPR KAB.KEPAHANG

Ir. ABDUL HAKIS, S.T., MT
NIP.198103112006041007

DIPERIKSA OLEH :

Konsultan Pengawasan
PT. PANDU SATYA PERKASA

DZULHAD AGAM R., ST
Inspector

DIBUAT OLEH:

Kontraktor Pelaksanaan
CV.PUTRA SAGO MANDIRI

RAZI HADIYANTO, ST
PELAKSANA

CATATAN :

PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHANG
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
BIDANG BINA MARGA

Alamat : Jln. Baru Desa Tebat Monok Kelilik Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang



SHOP DRAWING

**PENINGKATAN/REKONSTRUKSI JALAN
SOSOKAN TABA - CINTO MANDI
(LANJUTAN DBH 2024)
TA.2025**

PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHANG
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
BIDANG BINA MARGA

Alamat : Jln. Baru Desa Tebat Monok Kelilik Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang



LEMBAR PENGESAHAN

PENINGKATAN/REKONSTRUKSI JALAN SOSOKAN TABA - CINTO MANDI
(LANJUTAN DEH 2024)
TA.2025

DIKETAKUI OLEH :
PENGGUNA ANGGARAN
DINAS PUPR KAB.KEPAHIANG BIDANG BINA MARGA

TEDDY ADEBA, ST, ME
Nip : 19801006 2005021003

DISETUJUI OLEH :
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
DINAS PUPR KAB.KEPAHIANG BIDANG BINA MARGA

Ir. HARDIONO, ST, M.T
Nip : 197609022010011009

DIPERIKSA OLEH :
KONSULTAN SUPERVISI
PT.PANDU SATYA PERKASA

ARIS SAPUTRA, S.T
Supervision Engineer

DIBUAT OLEH :
KONTRAKTOR PELAKSANA
CV.PUTRA SAGO MANDIRI

ROSYID ABDULLOH AL AZIZ, ST
Manager Proyek


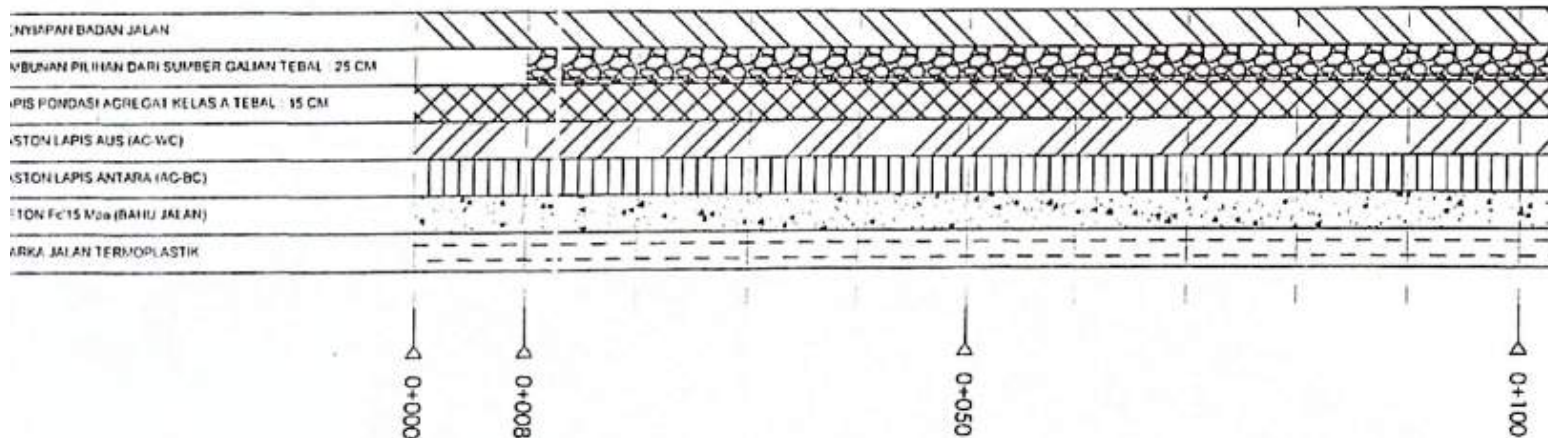
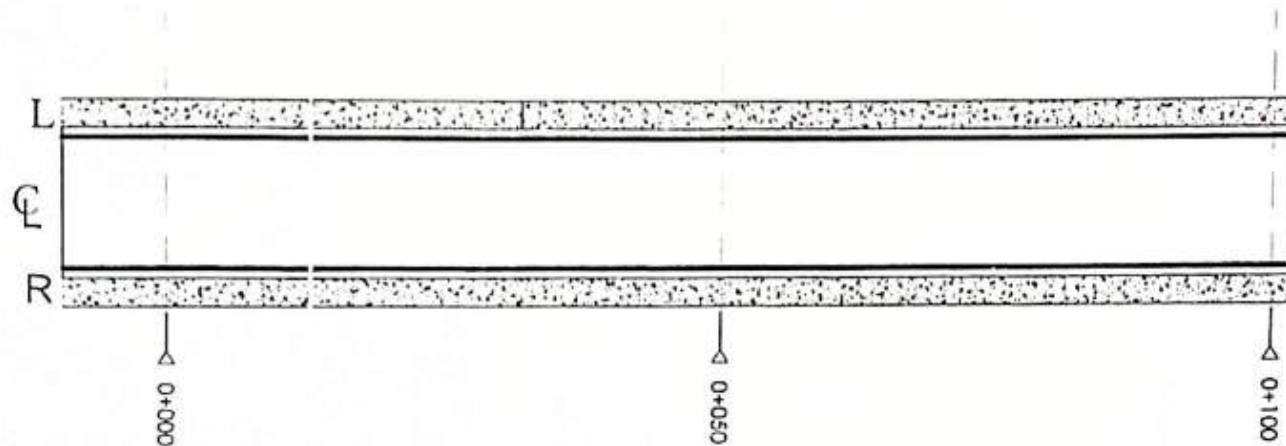


DIAGRAM PENANGANAN

PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHANG
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PUSKAS BINA MUDA
Alamat: Jl. Sekeloa Baru No. 100, Sekeloa Baru, Kabupaten Kepahang

SHOP DRAWING

PAKET PEKERJAAN :

PENINGKATAN/REKONSTRUKSI JALAN
SOSOKAN TABA - CINTO MANDI
(LANJUTAN DBH 2024)

RUAS :

SOSOKAN TABA - CINTO MANDI

JUDUL GAMBAR

DIAGRAM PENANGANAN

DISETUJUI OLEH :

Pengawas
DINAS PUPR KAB KEPAHANG

I. ABDUL HAKIS, S.T.MT
NIP. 19810311006041007

DIPERIKSA OLEH :

Kontraktor Pengawas
PT. PANDU SATYA PERKASA


DZULHAD AGAM R, ST
Inspector

DIBUAT OLEH :

Kontraktor Pelaksana
CV. PUTRA SAGO MANDIRI

RAZI HARDIANTO, ST
PELAKSANA

CATATAN :

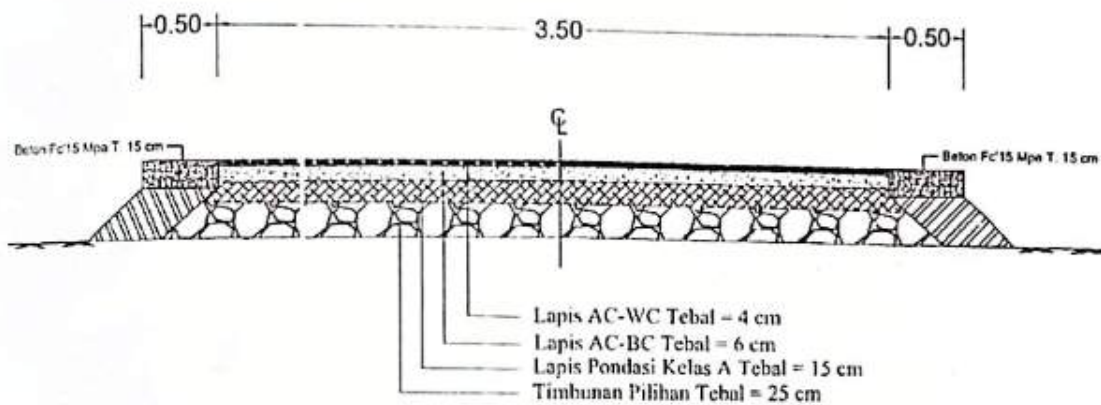

TYPICAL POTONGAN MELLINTANG JALAN
 STA 0+008 - 0+218
 STA 0+325 - 0+350

LEGENDA

- SPK. AUS AC-WC
- LAPIS PONDASI AGREGAT KELAS A
- BETON FC 15 Mpa
- SPK. ANTARA AC-BC
- TIMBUNAN PILIHAN SUMBER GALIAN
- PASANGAN BATU DENGAN MORTAR

PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHANG
 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
 BIDANG BINA MARGA
 Alamat: Jl. Raya Sagar Sagar Kecamatan Klaten Kabupaten Klaten

SHOP DRAWING

PAKET PEKERJAAN :

PENINGKATAN/REKONSTRUKSI JALAN
 SOSOKAN TABA - CINTO MANDI
 (LANJUTAN DBH 2024)

RUAS :

SOSOKAN TABA - CINTO MANDI

JUDUL GAMBAR

TYPICAL JALAN

DISETUJUI OLEH :

Pengawas
 DINAS PUPR KAB. KEPAHANG

[Signature]
 H. ABDUL HAKIS, S.T., MT
 NIP.198103112006041007

DIPERIKSA OLEH :

Kontraktor Pengawas
 PT. PANDU SATYA PERKASA

[Signature]
 DZULHAD AGAM R., ST
 Inspektur

DIBUAT OLEH:

Kontraktor Pelaksanaan
 CV. PUTRA SAGO MANDIRI

[Signature]
 ROSYID ABDULLAH AL AZIZ, ST
 Manajer Proyek

CATATAN :
